
OUTIL WEB · BTP · FRANCE

Contrat Game

Pilotez la gestion contractuelle et financière de vos chantiers, simplement et en toute traçabilité.

DIFFUSION · COURRIERS · JOURNAL · DÉTAIL ESTIMATIF · SITUATIONS · PRIX NOUVEAUX · SOUS-TRAITANCE · MATRICE FOURNISSEURS · BOÎTE À OUTILS · ASSURANCES

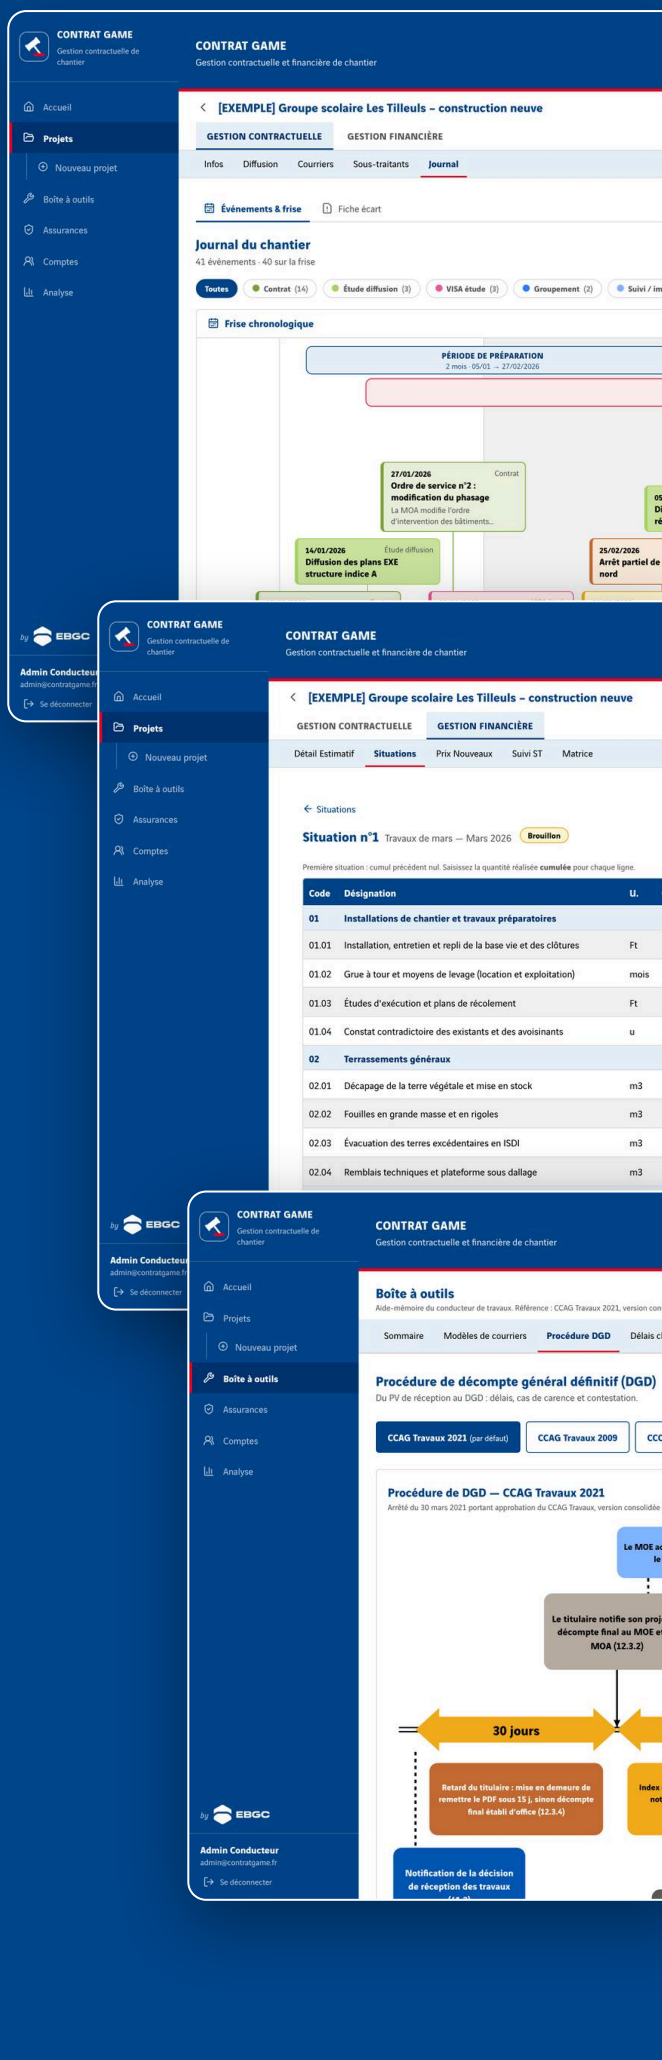

Présentation de l'application
Édition novembre 2026

by EBGC

SOMMAIRE

Au programme

Une visite guidée de l'application, module par module, illustrée par des captures réelles du projet de démonstration **« [EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve »**.

INTRODUCTION

01 Pourquoi Contrat Game 03

PRISE EN MAIN

02 Accueil & projets 04

GESTION CONTRACTUELLE

03 Infos projet, modules & membres 05

04 Liste de diffusion 06

05 Courriers 07

06 Sous-traitants 08

07 Journal & frise chronologique 09

08 Liste des événements & export de la frise 10

09 Fiche écart 11

GESTION FINANCIÈRE

10 Détail estimatif & co-traitance 12

11 Situations de travaux 13

12 Situations : PN, sous-traitants, décompte 14

13 Situations : exports PDF & Excel 15

14 Prix nouveaux 16

15 Suivi ST 17

16 Matrice décisionnelle fournisseurs 18

BOÎTE À OUTILS

17 Sommaire & modèles de courriers 19

18 Procédure DGD & délais clés 20

19 Calculateurs 21

20 Lexique 22

ASSURANCES

21 Panorama & aide à la décision 23

22 Bons réflexes, fiches & sinistres 24

ADMINISTRATION

23 Analyse (administrateur) 25

24 Comptes & sécurité 26

25 Profil & en-tête société 27

DOCUMENTS

26 Exports PDF & Excel 28

27 Démarrer en 3 étapes 29

28 Contact 30

POURQUOI CONTRAT GAME

Le contrat, au cœur du chantier

Sur un chantier, la marge se joue souvent dans les détails contractuels : une réserve non écrite, un ordre de service oublié, une situation mal calée. **Contrat Game** réunit au même endroit tout ce dont le conducteur de travaux a besoin pour défendre ses droits et piloter son chiffre d'affaires, quel que soit le type d'ouvrage.

1

Traçabilité

Liste de diffusion, courriers, journal et pièces jointes : chaque échange est daté et classé. La frise chronologique, avec ses périodes, restitue l'historique en un coup d'œil.

2

Réclamations

Fiches écart, prix nouveaux, courriers de réserves et mises en demeure : la réclamation se construit au fil de l'eau, pas en fin de chantier.

3

Situations de travaux

Avancements saisis ligne par ligne, prix nouveaux avec OS intégrés, montants des sous-traitants et décompte : PDF et Excel prêts à transmettre.

4

Sous-traitance

Marchés, avenants, facturations mensuelles, paiement direct : le suivi des sous-traitants est synchronisé avec les situations.

5

Achats

La matrice décisionnelle « Bid Comp » compare objectivement les offres fournisseurs et documente le choix.

6

Boîte à outils


Modèles de courriers, procédure DGD, délais clés, calculateurs et lexique, plus un espace Assurances fondé sur le Guide des assurances 2026.

Un seul outil, partagé par l'équipe travaux, pour **écrire**, **tracer**, **chiffrer** et **facturer** — accessible depuis un PC ou une tablette, sans installation.


PRISE EN MAIN

Accueil & projets

Le bandeau illustré et la barre latérale bleue restent toujours visibles. L'accueil donne accès aux grands espaces de l'outil, aux projets récents et à cette présentation.

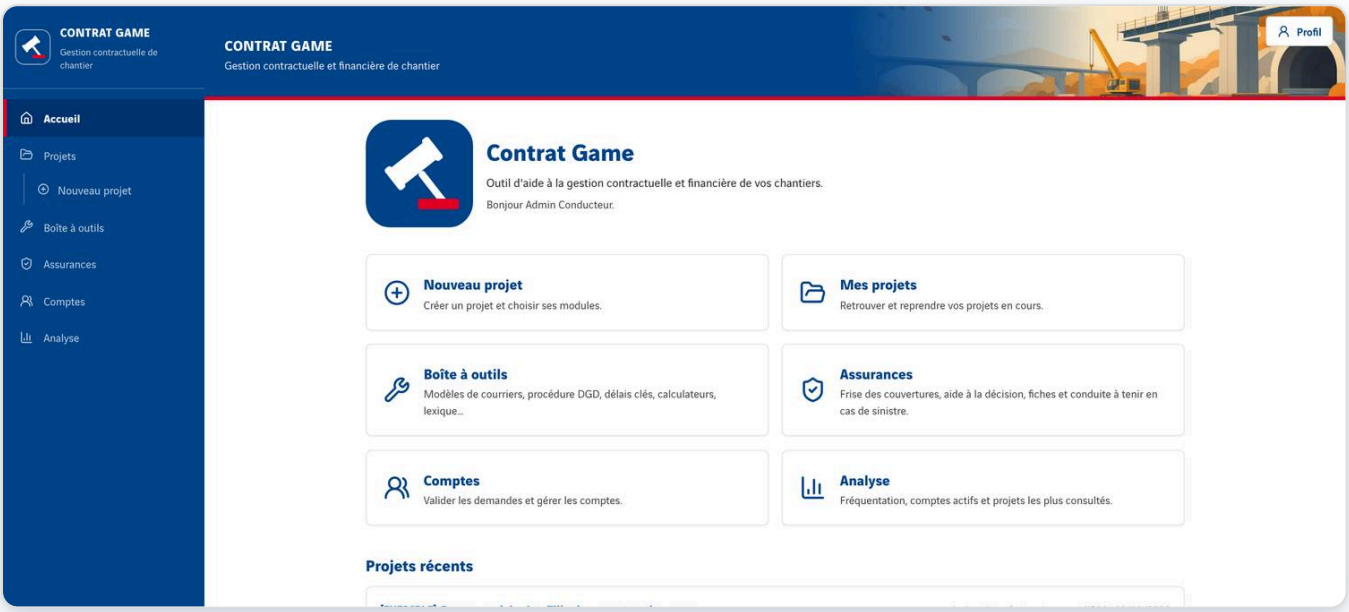

Page d'accueil : raccourcis vers les espaces, projets récents et présentation du site.

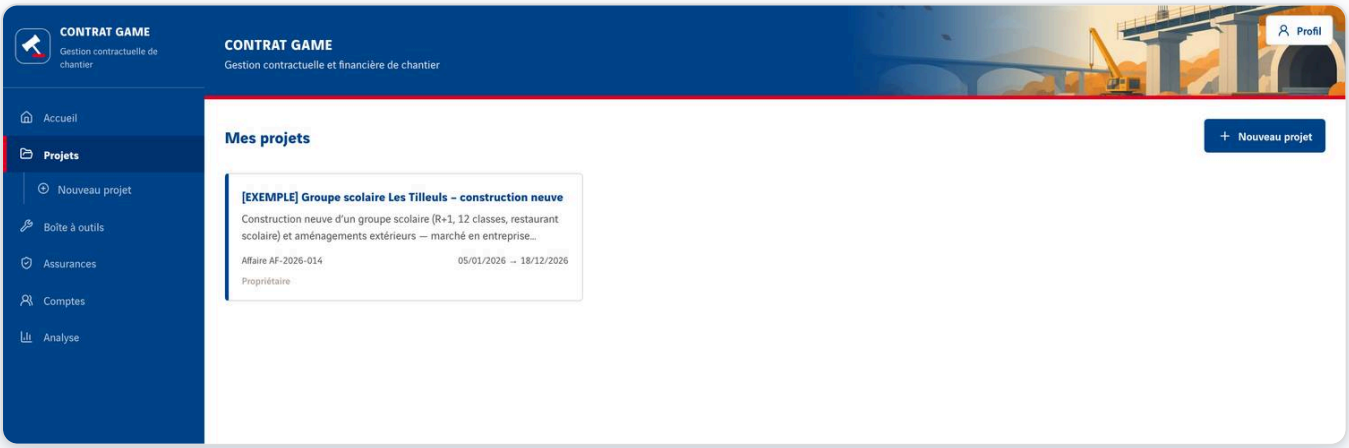

Mes projets : chaque utilisateur ne voit que les projets dont il est membre.

Barre latérale permanente

Accueil, Projets (avec son sous-menu Nouveau projet), Boîte à outils, Assurances, et pour l'administrateur Comptes et Analyse.

Navigation par projet

Deux onglets, **Gestion contractuelle** et **Gestion financière**, avec un sous-menu par module.

Projets récents

Reprise rapide du dernier projet consulté, avec un résumé de son activité.


PC & tablette

Interface responsive, pensée pour le bureau de chantier comme pour la réunion.


GESTION CONTRACTUELLE

Infos projet, modules & membres

La fiche projet centralise l'identité de l'opération et permet de choisir les modules utiles et les personnes qui y ont accès.

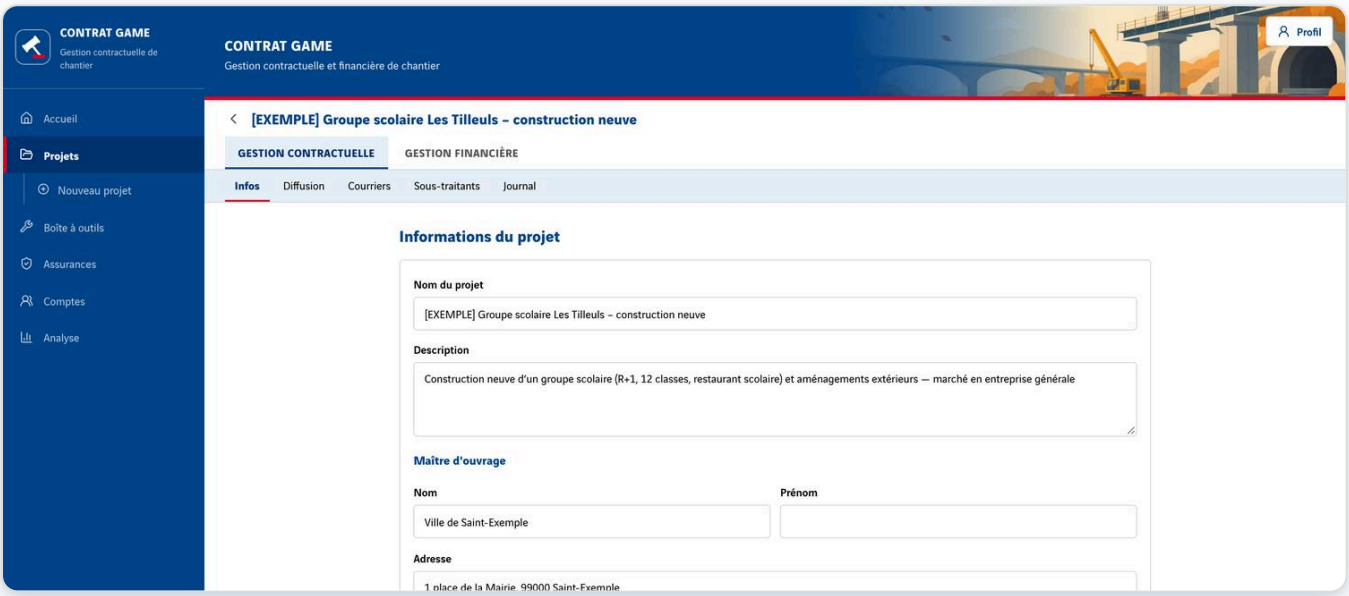

Informations du projet : description, maître d'ouvrage, références et adresse du chantier.

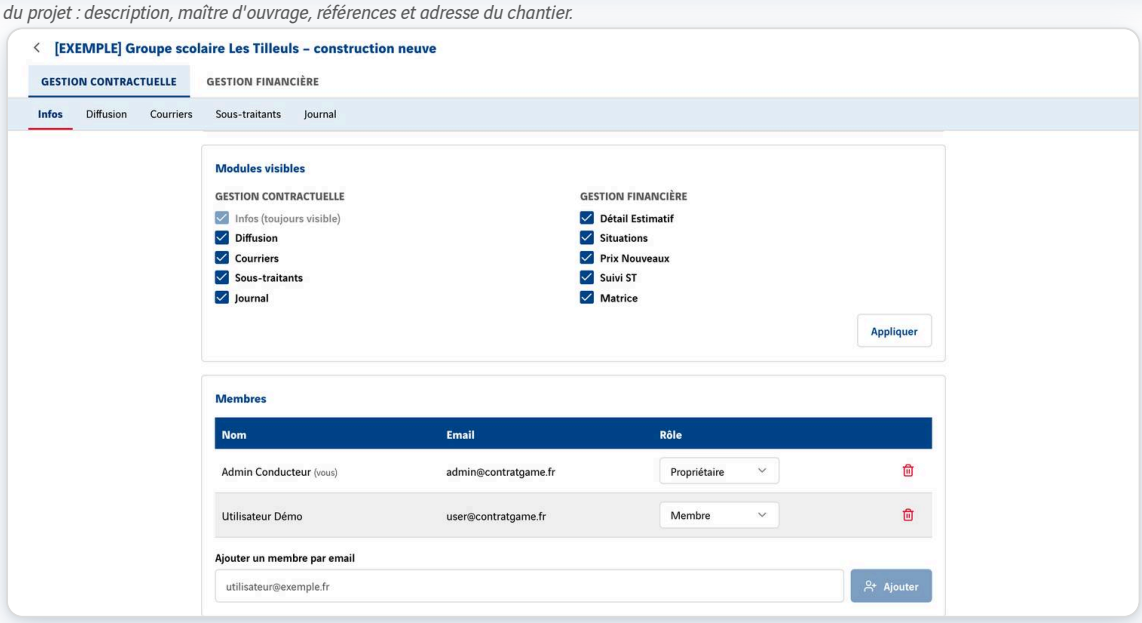

Modules visibles, membres du projet et zone de danger.

Identité de l'opération

Nom, description, maître d'ouvrage, n° d'affaire, de commande et OTP, adresse du chantier, dates.

Modules à la carte

Des cases à cocher masquent les modules inutiles sur ce projet : l'interface reste épurée.

Membres du projet

Ajout d'un collègue par e-mail, rôle **propriétaire** ou **membre**, retrait en un clic.


Zone de danger

La suppression d'un projet est isolée et confirmée, pour éviter toute fausse manœuvre.


GESTION CONTRACTUELLE · NOUVEAU

Liste de diffusion

Tous les intervenants du chantier, classés par rôle, avec leurs coordonnées et leur règle de diffusion. La liste sert ensuite à préremplir le destinataire et les copies de chaque courrier.

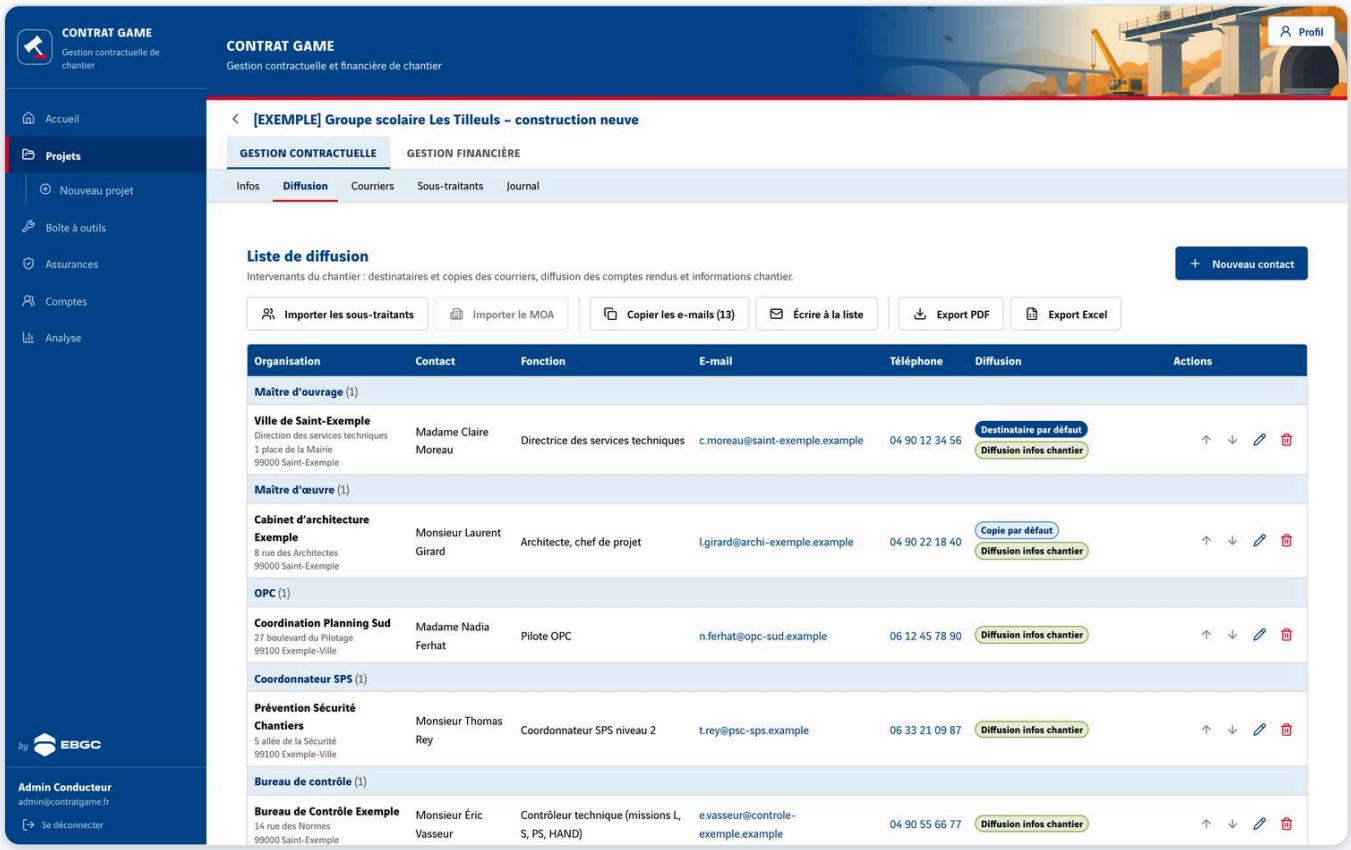

Contacts regroupés par rôle (maître d'ouvrage, maître d'œuvre, OPC, SPS, contrôle…), badges de diffusion et barre d'actions.

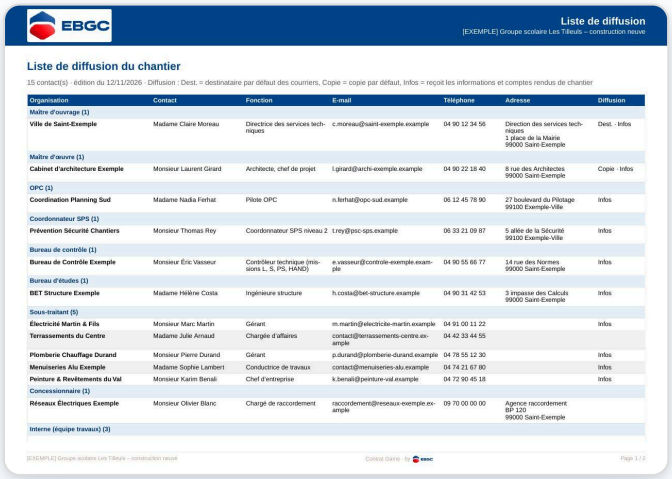

Export PDF de la liste de diffusion (A4 paysage).

Contacts par rôle

Organisation, contact, fonction, e-mail, téléphone ; contacts réordonnables au sein de chaque rôle.

Destinataire & copie par défaut

Un badge désigne le destinataire et les copies proposés d'office dans les courriers.

Import en un clic

Reprise des sous-traitants et du maître d'ouvrage déjà saisis dans le projet.

Copier les e-mails

Toutes les adresses dans le presse-papiers, prêtes à coller.

Écrire à la liste

Ouvre un message adressé à toute la liste depuis votre messagerie.


Exports PDF & Excel

Une liste à jour à joindre au compte rendu de réunion.


GESTION CONTRACTUELLE

Courriers

Rédigez vos courriers contractuels à partir de modèles types, choisissez destinataire et copies dans la liste de diffusion, et générez un PDF au format courrier officiel à l'en-tête de votre société.

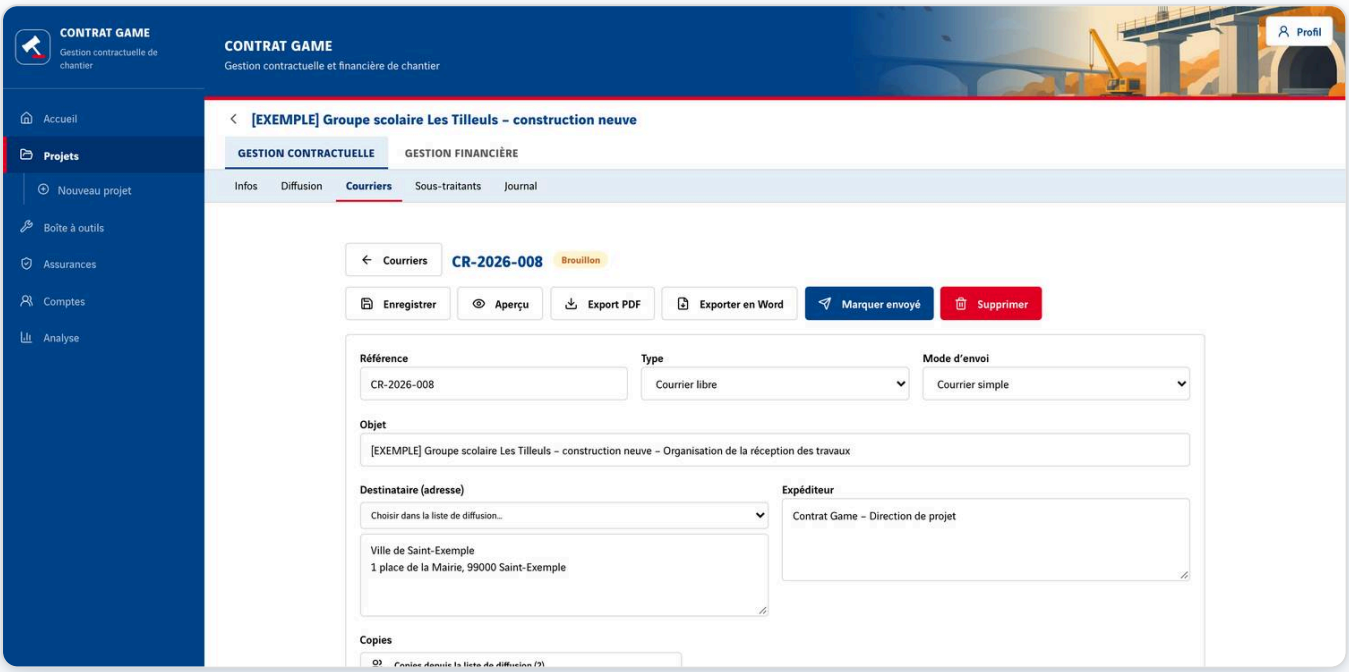

Édition d'un courrier : destinataire choisi dans la liste de diffusion, copies reprises en un clic, statut, mode d'envoi.

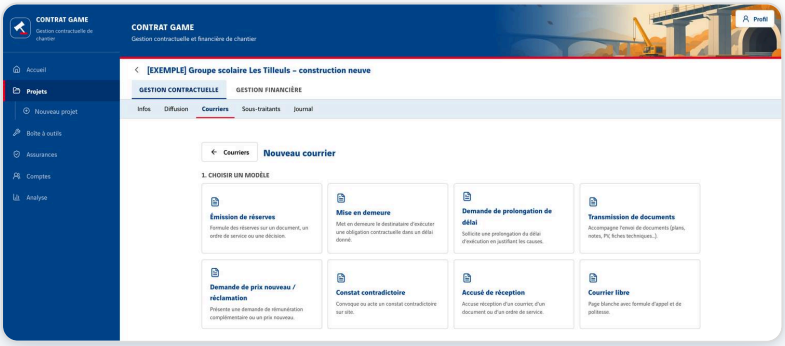

Nouveau courrier : choix du modèle type.



Courrier officiel exporté en PDF.

Modèles types

Réserves, mise en demeure, prolongation de délai, transmission de documents, prix nouveau, constat…

Liste de diffusion

Destinataire et copies sélectionnés parmi les contacts du projet, avec leurs adresses.

PDF & Word

PDF au format courrier officiel, ou export Word pour une mise en forme libre.


Lien avec le journal

Un courrier envoyé crée automatiquement un événement dans le journal du chantier.

GESTION CONTRACTUELLE

Sous-traitants

Une fiche par sous-traitant : coordonnées, paiement direct, montant du marché et avenants. Ces fiches alimentent le Suivi ST, les situations et la liste de diffusion.

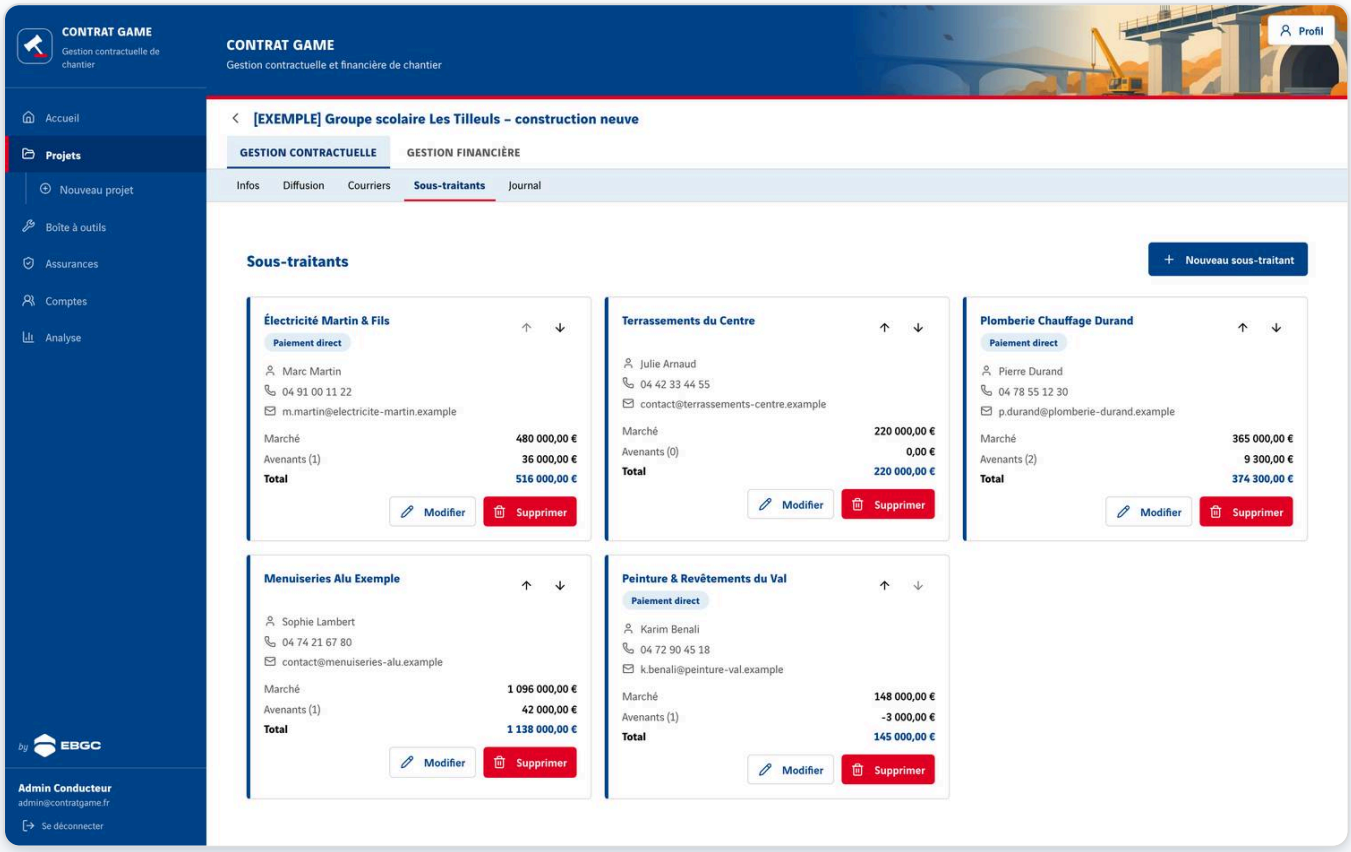

Fiches sous-traitants : contact, badge « Paiement direct », marché, avenants et total.

Fiches complètes

Contact, téléphone, e-mail, paiement direct, commentaire.

Avenants numérotés

Libellé, montant (positif ou négatif) et date : le total du marché se met à jour.

Paiement direct

Les sous-traitants payés directement par le maître d'ouvrage sont déduits dans le décompte de la situation.

Réutilisés partout


Import dans la liste de diffusion, suivi financier, montants saisis dans les situations.

Les sous-traitants déclarés ici se retrouvent automatiquement dans le **Suivi ST** et dans la section sous-traitants des **situations** ; ils peuvent être importés dans la **liste de diffusion** en un clic.


GESTION CONTRACTUELLE

Journal & frise chronologique

Le journal consigne tous les faits marquants du chantier. La frise chronologique les met en perspective, avec des périodes en bandeaux : préparation, délais contractuels, phases de travaux, fermetures.

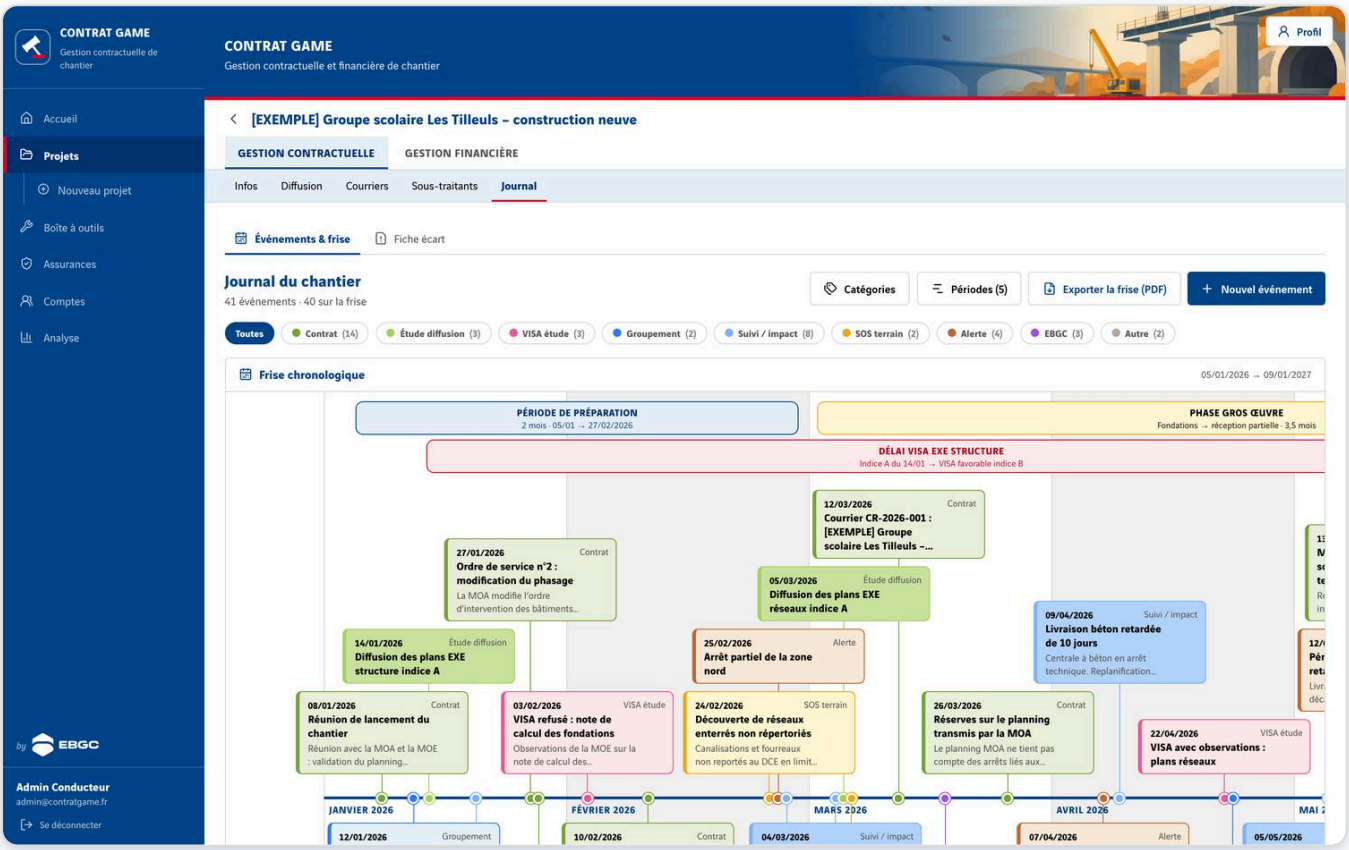

Frise chronologique : bandeaux de périodes en haut, bulles colorées par catégorie, toujours à l'aplomb de leur date.

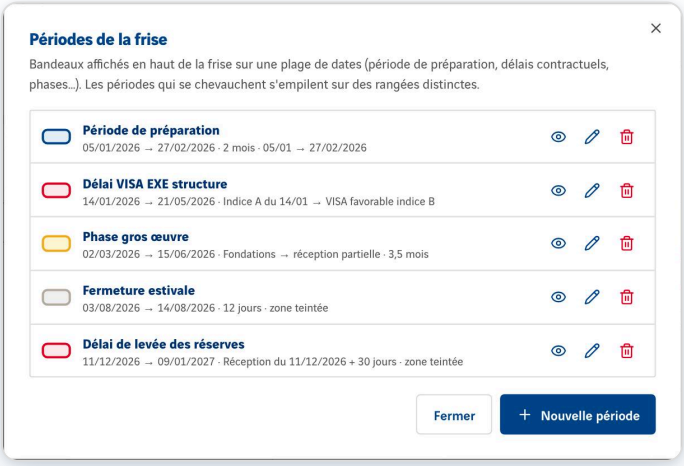

Gestion des périodes de la frise.

Périodes en bandeaux

« Période de préparation », « Phase gros œuvre », délai VISA, fermeture estivale... Les périodes qui se chevauchent s'empilent sur des rangées distinctes.

Catégories colorées

Catégories système et personnalisées, filtres par pastilles cliquables.

Pièces jointes

Photos et PDF attachés à chaque événement, repris en annexe de l'export.


Frise lisible

Placement automatique anti-chevauchement, sans jamais décaler une bulle de sa date.

GESTION CONTRACTUELLE

Événements & export de la frise

La liste des événements reprend tout l'historique ; l'export PDF de la frise produit un document A4 paysage prêt pour une réunion ou un mémoire en réclamation.

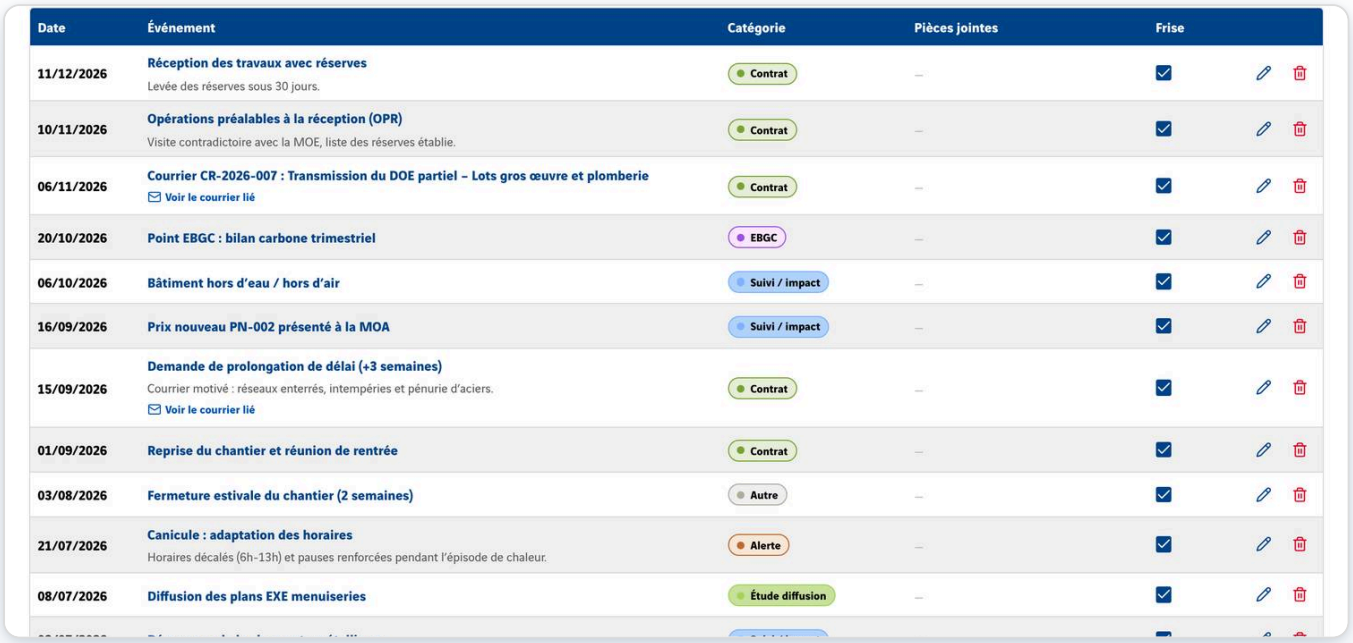


Date	Événement	Catégorie	Pièces jointes	Frise
11/12/2026	**Réception des travaux avec réserves** Levée des réserves sous 30 jours.	Contrat	–	☑
10/11/2026	**Opérations préalables à la réception (OPR)** Visite contradictoire avec la MOE, liste des réserves établie.	Contrat	–	☑
06/11/2026	**Courrier CR-2026-007 : Transmission du DOE partiel – Lots gros œuvre et plomberie** Voir le courrier lié	Contrat	–	☑
20/10/2026	**Point EBGC : bilan carbone trimestriel**	EBGC	–	☑
06/10/2026	**Bâtiment hors d'eau / hors d'air**	Suivi / impact	–	☑
16/09/2026	**Prix nouveau PN-002 présenté à la MOA**	Suivi / impact	–	☑
15/09/2026	**Demande de prolongation de délai (+3 semaines)** Courrier motivé : réseaux enterrés, intempéries et pénurie d'aciers. Voir le courrier lié	Contrat	–	☑
01/09/2026	**Reprise du chantier et réunion de rentrée**	Contrat	–	☑
03/08/2026	**Fermeture estivale du chantier (2 semaines)**	Autre	–	☑
21/07/2026	**Canicule : adaptation des horaires** Horaires décalés (6h-13h) et pauses renforcées pendant l'épisode de chaleur.	Alerte	–	☑
08/07/2026	**Diffusion des plans EXE menuiseries**	Étude diffusion	–	☑

Liste des événements : date, catégorie, lien vers le courrier d'origine, pièces jointes, affichage sur la frise.



Choix de la période avant export : nombre d'événements, de périodes et d'images jointes.

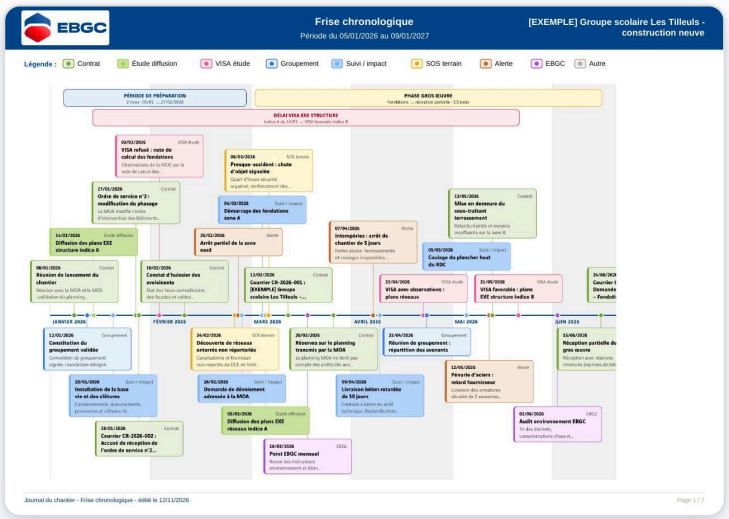

Frise exportée : en-tête, légende des catégories, périodes et bulles.

Étalement automatique

La frise occupe toute la largeur de la page, sur plusieurs pages si nécessaire, découpées entre les bulles.


Dossier complet

Périodes, tableau des événements de la période et photos jointes en annexe.

GESTION CONTRACTUELLE

Fiche écart

La fiche écart compare ce qui était prévu au DCE à ce qui est réellement exécuté, et chiffre les conséquences en délais et en coûts : la base d'une réclamation argumentée.

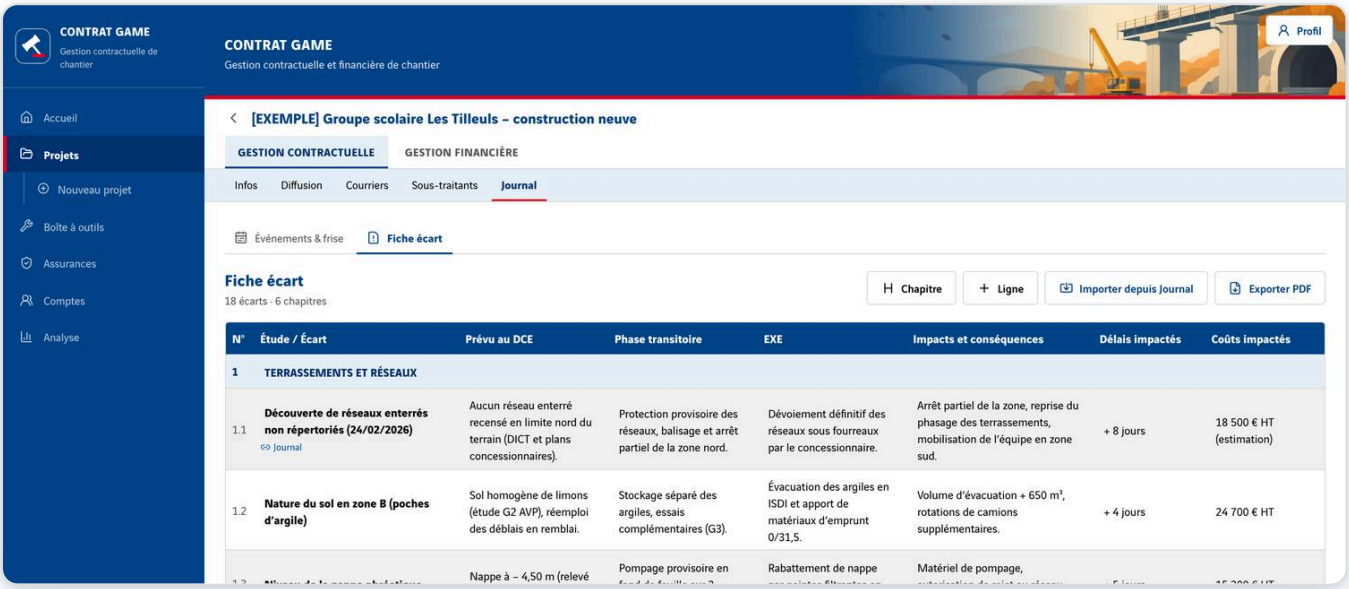

Fiche écart organisée par chapitres, avec import direct depuis le journal.

Étude / Écart | **Prévu au DCE** | **Phase transitoire** | **EXE** | **Impacts et conséquences** | **Délais impactés** | **Coûts impactés**

Import depuis le journal

Sélection d'événements : une ligne par événement, titre et date repris. Les événements déjà importés sont exclus.

Saisie fluide

Cellules qui s'agrandissent avec le texte, enregistrement automatique en continu.

Organisation par chapitres

Regroupez les écarts par thème (réseaux, fondations, façades…) pour une lecture structurée.

Export PDF paysage

Même structure que l'écran, prêt à joindre à un mémoire ou un compte rendu.

Du fait au chiffrage : un événement noté dans le **journal** devient une ligne de la **fiche écart**, puis, si besoin, un **prix nouveau** et un **courrier** de réclamation.

GESTION FINANCIÈRE

Détail estimatif & co-traitance

Le Détail estimatif se saisit comme un tableur : chapitres, lignes, quantités et prix unitaires. Il sert de socle aux situations et à la répartition entre co-traitants.


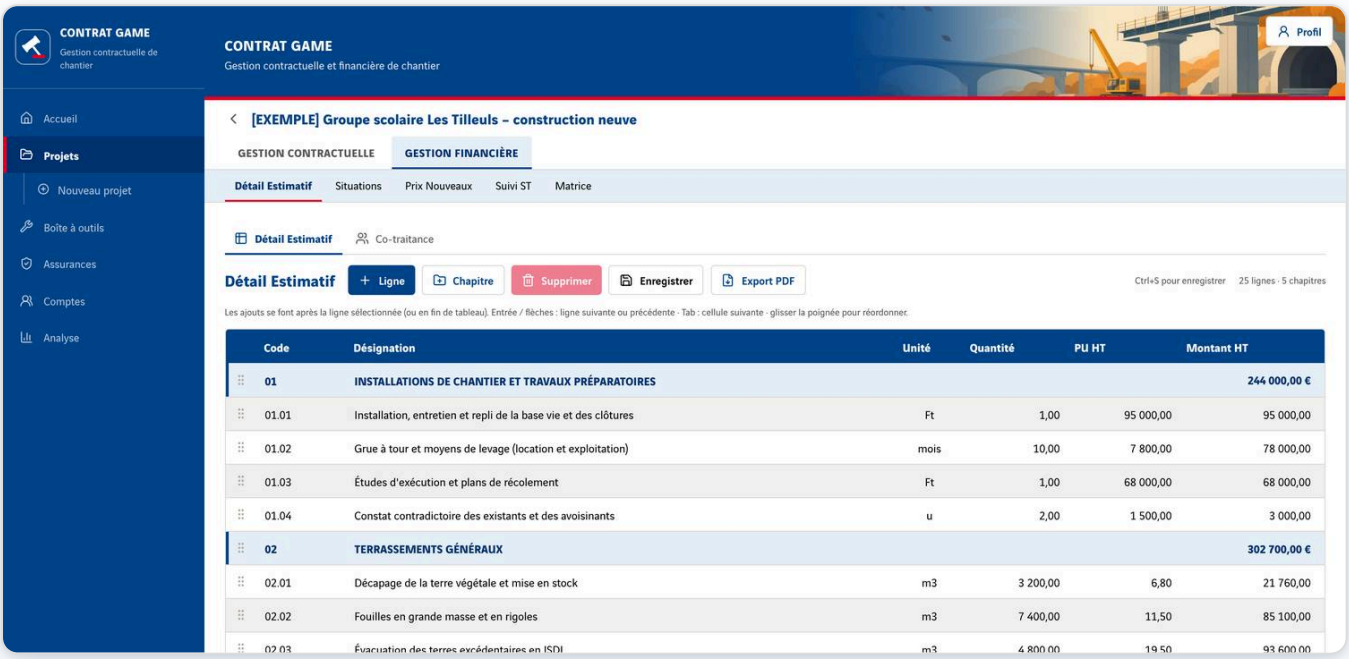


Tableau éditable type Excel, sous-totaux par chapitre et total général HT.

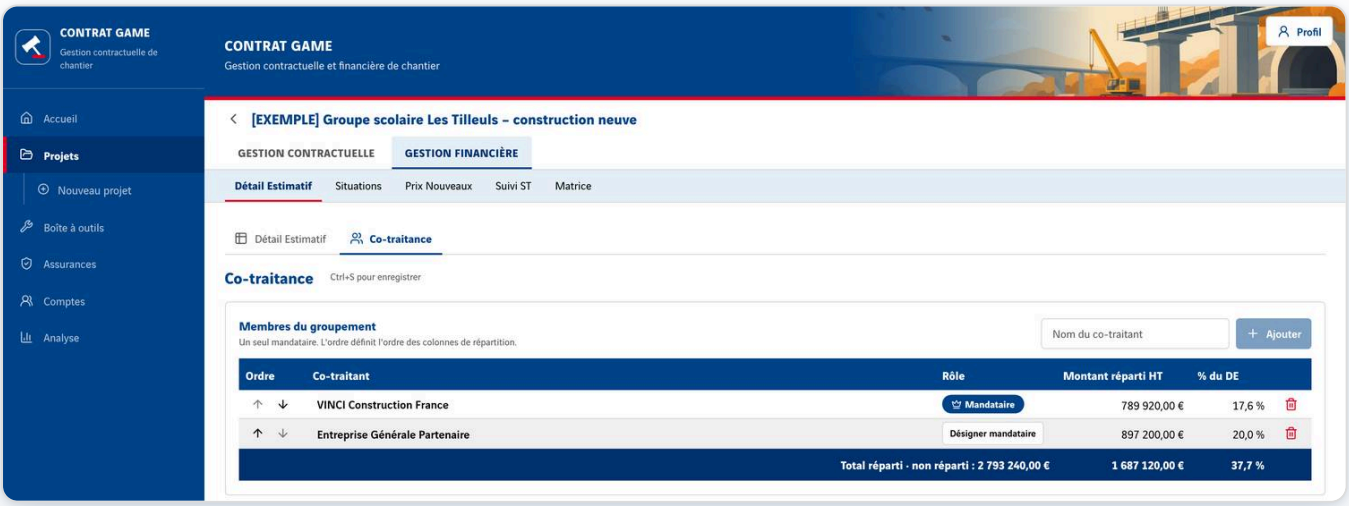

Co-traitance : membres du groupement et répartition des prix unitaires ligne par ligne.

Comme un tableur

Saisie au clavier, enregistrement automatique, Ctrl+S, réordonnancement par glisser-déposer.

Grands volumes

Tableau virtualisé : fluide même avec des centaines de lignes. Export PDF.


Groupement

Mandataire, co-traitants, répartition du PU et totaux par entreprise, écarts signalés.

GESTION FINANCIÈRE


Situations de travaux

Chaque mois, saisissez la quantité réalisée cumulée de chaque ligne du Détail estimatif : Contrat Game calcule le mois, les cumuls, les pourcentages et les montants.

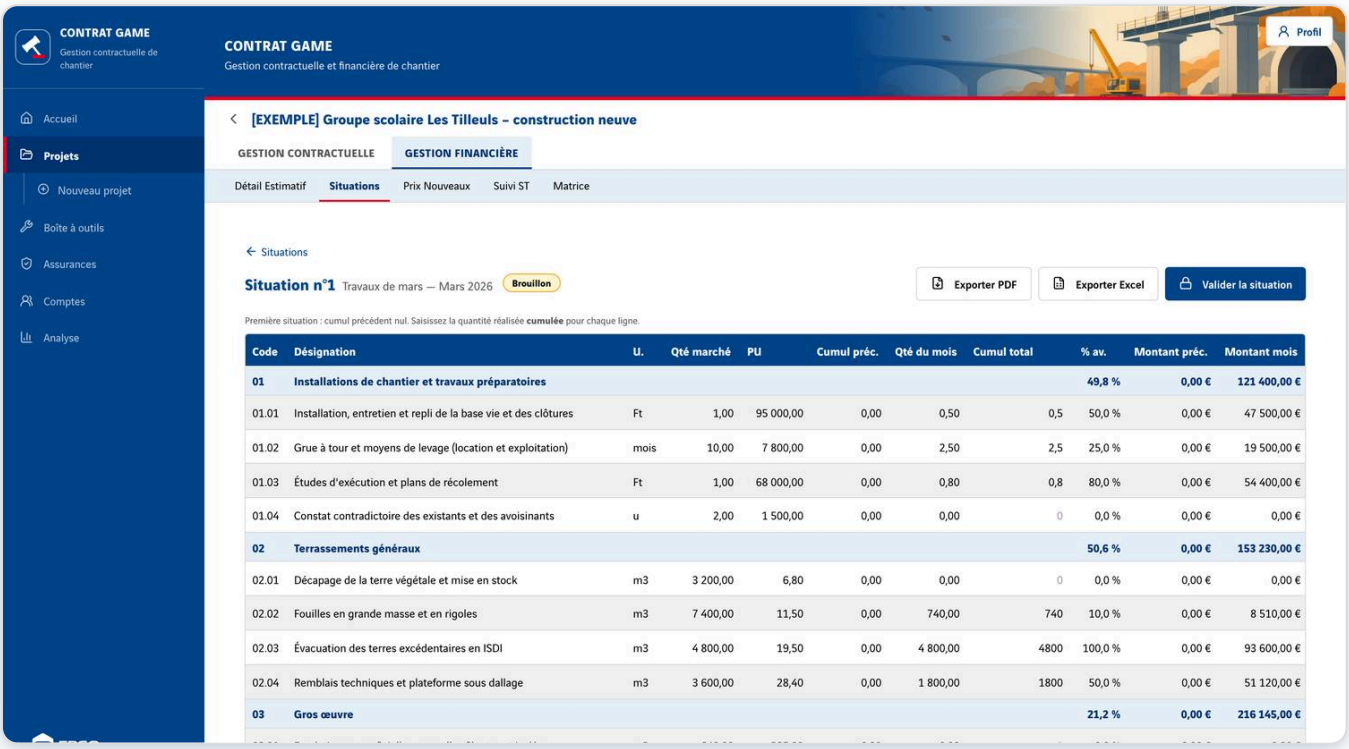

Code	Désignation	U.	Qté marché	PU	Cumul préc.	Qté du mois	Cumul total	% av.	Montant préc.	Montant mois
01	**Installations de chantier et travaux préparatoires**							49,8 %	0,00 €	121 400,00 €
01.01	Installation, entretien et repli de la base vie et des clôtures	Ft	1,00	95 000,00	0,00	0,50	0,5	50,0 %	0,00 €	47 500,00 €
01.02	Grue à tour et moyens de levage (location et exploitation)	mois	10,00	7 800,00	0,00	2,50	2,5	25,0 %	0,00 €	19 500,00 €
01.03	Études d'exécution et plans de récolement	Ft	1,00	68 000,00	0,00	0,80	0,8	80,0 %	0,00 €	54 400,00 €
01.04	Constat contradictoire des existants et des avoisinants	u	2,00	1 500,00	0,00	0,00	0	0,0 %	0,00 €	0,00 €
02	**Terrassements généraux**							50,6 %	0,00 €	153 230,00 €
02.01	Décapage de la terre végétale et mise en stock	m3	3 200,00	6,80	0,00	0,00	0	0,0 %	0,00 €	0,00 €
02.02	Fouilles en grande masse et en rigoles	m3	7 400,00	11,50	0,00	740,00	740	10,0 %	0,00 €	8 510,00 €
02.03	Évacuation des terres excédentaires en ISDI	m3	4 800,00	19,50	0,00	4 800,00	4800	100,0 %	0,00 €	93 600,00 €
02.04	Remblais techniques et plateforme sous dallage	m3	3 600,00	28,40	0,00	1 800,00	1800	50,0 %	0,00 €	51 120,00 €
03	**Gros œuvre**							21,2 %	0,00 €	216 145,00 €

Situation n°1 : cumul précédent, quantité du mois, cumul total, % d'avancement et montants ; exports PDF et Excel.

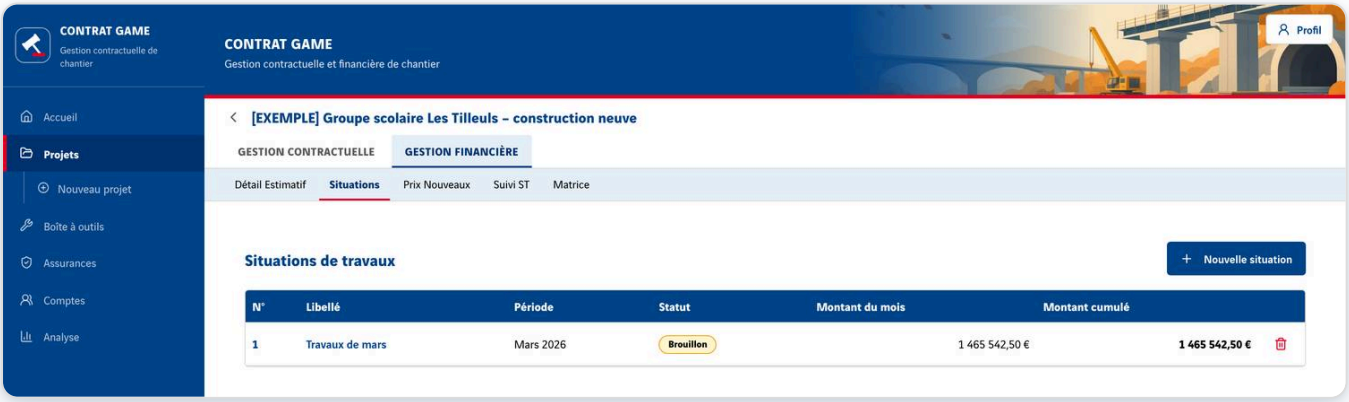

N°	Libellé	Période	Statut	Montant du mois	Montant cumulé
1	Travaux de mars	Mars 2026	Brouillon	1 465 542,50 €	1 465 542,50 €

Liste des situations du projet : période, statut, montant du mois et montant cumulé.

Numérotation automatique

Une situation par mois, numérotée, avec libellé et statut brouillon / validée (lecture seule une fois validée).

Avancements saisis

Quantité cumulée saisie ligne par ligne, prix unitaire figé au moment de la saisie.

Avancement

Pourcentage par ligne, par chapitre et global ; montants au format français.


Exports PDF & Excel

Le document à transmettre au maître d'œuvre, et un classeur pour vos propres analyses.

GESTION FINANCIÈRE

Prix nouveaux, sous-traitants & décompte

Sous le tableau du marché, la situation intègre les prix nouveaux ayant reçu un ordre de service, les montants facturés par les sous-traitants et le décompte du montant revenant à l'entreprise.

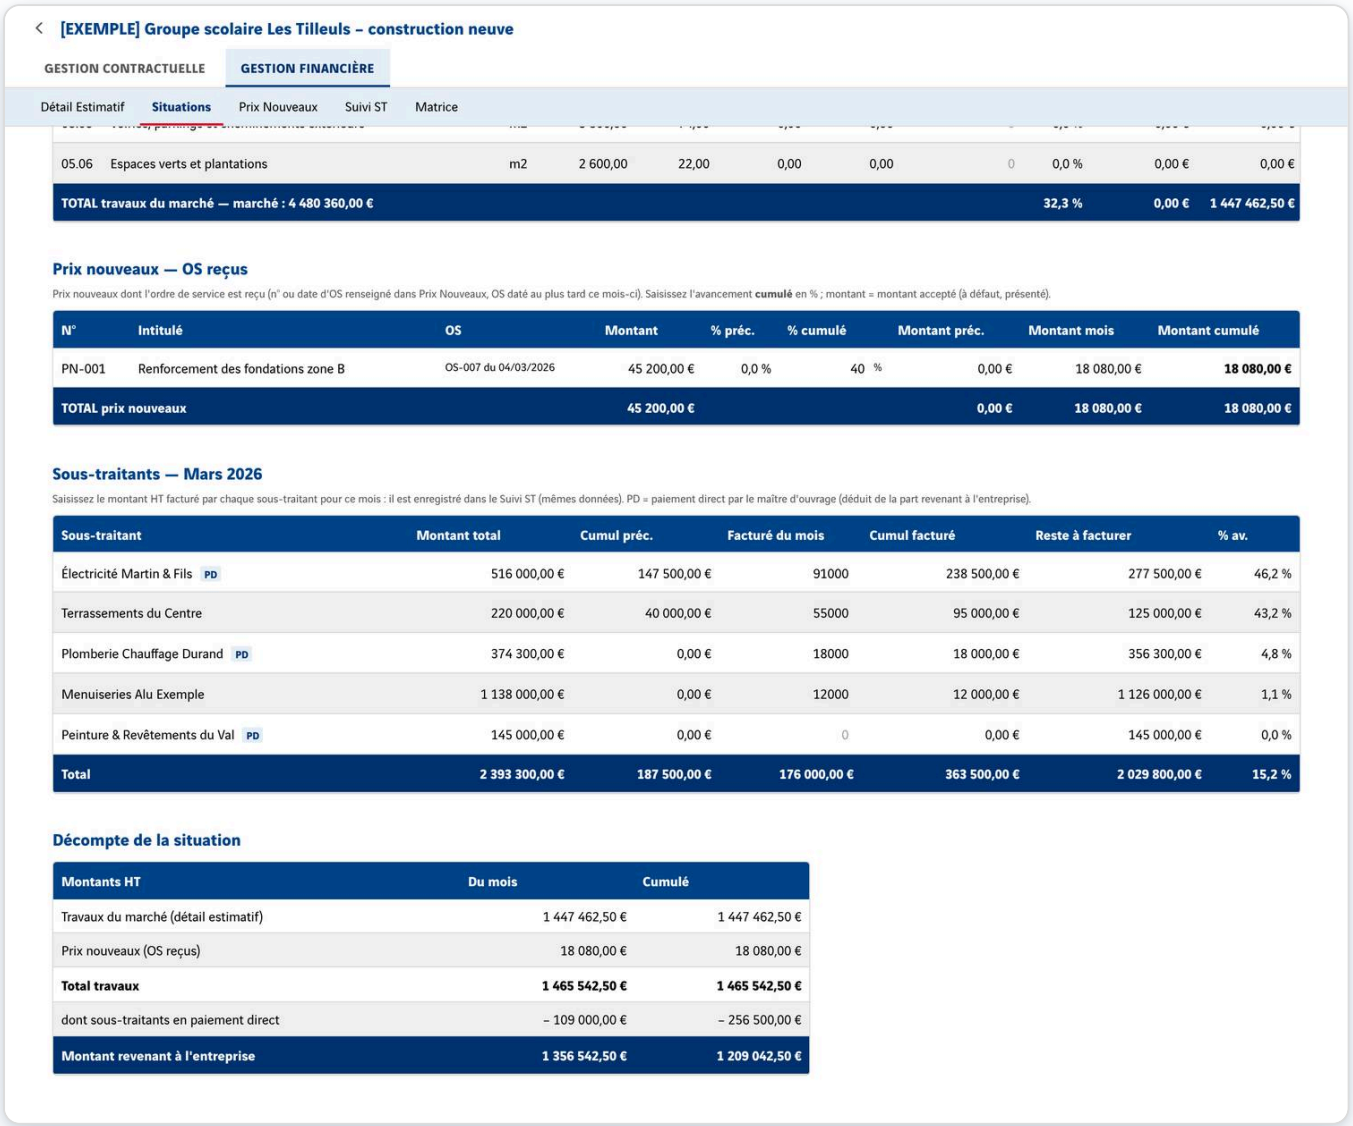

[EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve

GESTION CONTRACTUELLE | GESTION FINANCIÈRE

Détail Estimatif | Situations | Prix Nouveaux | Suivi ST | Matrice

05.06	Espaces verts et plantations	m2	2 600,00	22,00	0,00	0,00	0	0,0 %	0,00 €	0,00 €
TOTAL travaux du marché — marché : 4 480 360,00 €								**32,3 %**	**0,00 €**	**1 447 462,50 €**

Prix nouveaux — OS reçus

Prix nouveaux dont l'ordre de service est reçu (n° ou date d'OS renseigné dans Prix Nouveaux, OS daté au plus tard ce mois-ci). Saisissez l'avancement **cumulé** en % ; montant = montant accepté (à défaut, présenté).

N°	Intitulé	OS	Montant	% préc.	% cumulé	Montant préc.	Montant mois	Montant cumulé
PN-001	Renforcement des fondations zone B	OS-007 du 04/03/2026	45 200,00 €	0,0 %	40 %	0,00 €	18 080,00 €	**18 080,00 €**
TOTAL prix nouveaux			**45 200,00 €**			**0,00 €**	**18 080,00 €**	**18 080,00 €**

Sous-traitants — Mars 2026

Saisissez le montant HT facturé par chaque sous-traitant pour ce mois : il est enregistré dans le Suivi ST (mêmes données). PD = paiement direct par le maître d'ouvrage (déduit de la part revenant à l'entreprise).

Sous-traitant	Montant total	Cumul préc.	Facturé du mois	Cumul facturé	Reste à facturer	% av.
Électricité Martin & Fils PD	516 000,00 €	147 500,00 €	91000	238 500,00 €	277 500,00 €	46,2 %
Terrassements du Centre	220 000,00 €	40 000,00 €	55000	95 000,00 €	125 000,00 €	43,2 %
Plomberie Chauffage Durand PD	374 300,00 €	0,00 €	18000	18 000,00 €	356 300,00 €	4,8 %
Menuiseries Alu Exemple	1 138 000,00 €	0,00 €	12000	12 000,00 €	1 126 000,00 €	1,1 %
Peinture & Revêtements du Val PD	145 000,00 €	0,00 €	0	0,00 €	145 000,00 €	0,0 %
Total	**2 393 300,00 €**	**187 500,00 €**	**176 000,00 €**	**363 500,00 €**	**2 029 800,00 €**	**15,2 %**

Décompte de la situation

Montants HT	Du mois	Cumulé
Travaux du marché (détail estimatif)	1 447 462,50 €	1 447 462,50 €
Prix nouveaux (OS reçus)	18 080,00 €	18 080,00 €
Total travaux	**1 465 542,50 €**	**1 465 542,50 €**
dont sous-traitants en paiement direct	– 109 000,00 €	– 256 500,00 €
Montant revenant à l'entreprise	**1 356 542,50 €**	**1 209 042,50 €**

Prix nouveaux avec OS reçu (avancement en %), sous-traitants du mois et décompte de la situation.

Prix nouveaux avec OS

Chaque prix nouveau accepté par OS devient une ligne de la situation, avancée en pourcentage.

Montants ST synchronisés

Le montant facturé par chaque sous-traitant, saisi dans la situation, est enregistré dans le Suivi ST (et inversement).


Décompte

Travaux du marché + prix nouveaux, déduction de la part des sous-traitants en paiement direct : montant revenant à l'entreprise.

GESTION FINANCIÈRE

Situation exportée

Le PDF de situation reprend l'ensemble : tableau détaillé par chapitre, prix nouveaux, récapitulatif des sous-traitants et décompte. Le même contenu est disponible en classeur Excel.

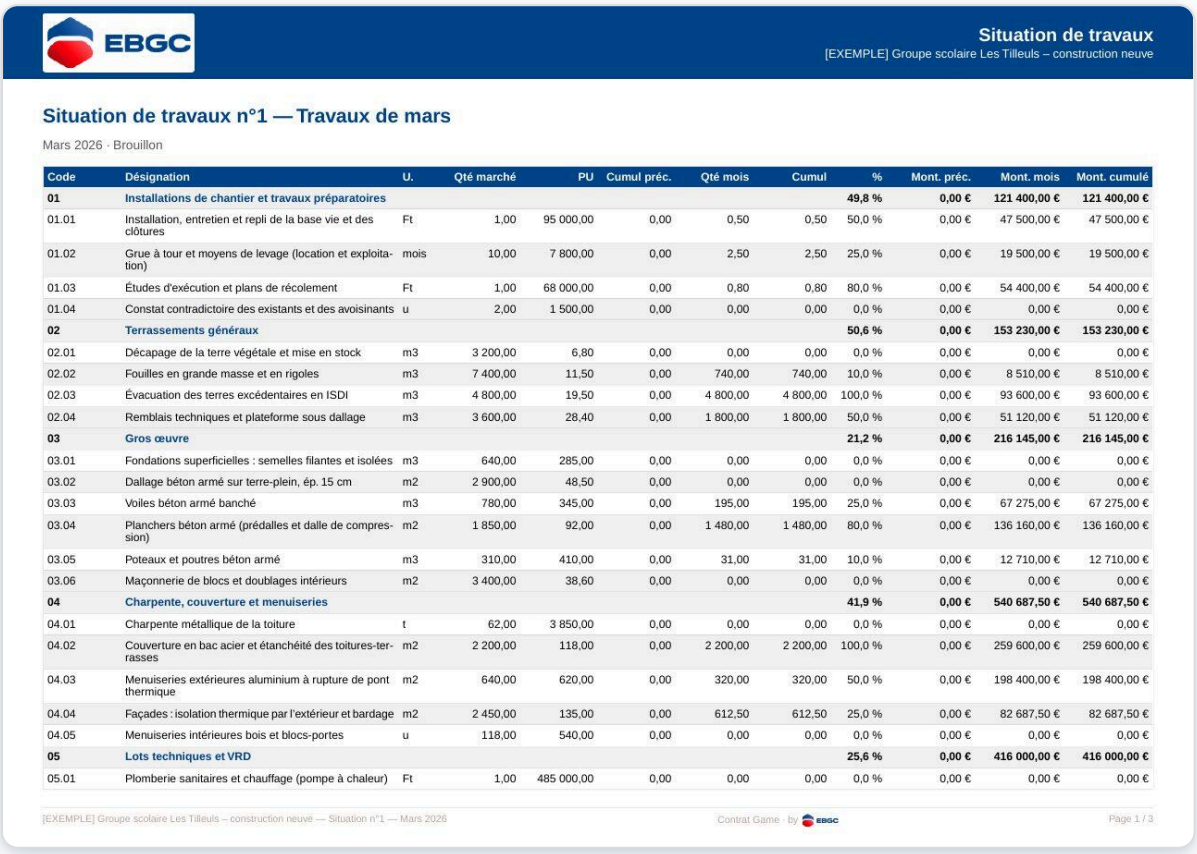

EBGC

Situation de travaux
[EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve


Situation de travaux n°1 — Travaux de mars

Mars 2026 · Brouillon

Code	Désignation	U.	Qté marché	PU	Cumul préc.	Qté mois	Cumul	%	Mont. préc.	Mont. mois	Mont. cumulé
01	**Installations de chantier et travaux préparatoires**							**49,8 %**	**0,00 €**	**121 400,00 €**	**121 400,00 €**
01.01	Installation, entretien et repli de la base vie et des clôtures	Ft	1,00	95 000,00	0,00	0,50	0,50	50,0 %	0,00 €	47 500,00 €	47 500,00 €
01.02	Grue à tour et moyens de levage (location et exploitation)	mois	10,00	7 800,00	0,00	2,50	2,50	25,0 %	0,00 €	19 500,00 €	19 500,00 €
01.03	Études d'exécution et plans de récolement	Ft	1,00	68 000,00	0,00	0,80	0,80	80,0 %	0,00 €	54 400,00 €	54 400,00 €
01.04	Constat contradictoire des existants et des avoisinants	u	2,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	**Terrassements généraux**							**50,6 %**	**0,00 €**	**153 230,00 €**	**153 230,00 €**
02.01	Décapage de la terre végétale et mise en stock	m3	3 200,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.02	Fouilles en grande masse et en rigoles	m3	7 400,00	11,50	0,00	740,00	740,00	10,0 %	0,00 €	8 510,00 €	8 510,00 €
02.03	Évacuation des terres excédentaires en ISDI	m3	4 800,00	19,50	0,00	4 800,00	4 800,00	100,0 %	0,00 €	93 600,00 €	93 600,00 €
02.04	Remblais techniques et plateforme sous dallage	m3	3 600,00	28,40	0,00	1 800,00	1 800,00	50,0 %	0,00 €	51 120,00 €	51 120,00 €
03	**Gros œuvre**							**21,2 %**	**0,00 €**	**216 145,00 €**	**216 145,00 €**
03.01	Fondations superficielles : semelles filantes et isolées	m3	640,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.02	Dallage béton armé sur terre-plein, ép. 15 cm	m2	2 900,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.03	Voiles béton armé banché	m3	780,00	345,00	0,00	195,00	195,00	25,0 %	0,00 €	67 275,00 €	67 275,00 €
03.04	Planchers béton armé (prédalles et dalle de compression)	m2	1 850,00	92,00	0,00	1 480,00	1 480,00	80,0 %	0,00 €	136 160,00 €	136 160,00 €
03.05	Poteaux et poutres béton armé	m3	310,00	410,00	0,00	31,00	31,00	10,0 %	0,00 €	12 710,00 €	12 710,00 €
03.06	Maçonnerie de blocs et doublages intérieurs	m2	3 400,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	**Charpente, couverture et menuiseries**							**41,9 %**	**0,00 €**	**540 687,50 €**	**540 687,50 €**
04.01	Charpente métallique de la toiture	t	62,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04.02	Couverture en bac acier et étanchéité des toitures-terrasses	m2	2 200,00	118,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0 %	0,00 €	259 600,00 €	259 600,00 €
04.03	Menuiseries extérieures aluminium à rupture de pont thermique	m2	640,00	620,00	0,00	320,00	320,00	50,0 %	0,00 €	198 400,00 €	198 400,00 €
04.04	Façades : isolation thermique par l'extérieur et bardage	m2	2 450,00	135,00	0,00	612,50	612,50	25,0 %	0,00 €	82 687,50 €	82 687,50 €
04.05	Menuiseries intérieures bois et blocs-portes	u	118,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	**Lots techniques et VRD**							**25,6 %**	**0,00 €**	**416 000,00 €**	**416 000,00 €**
05.01	Plomberie sanitaires et chauffage (pompe à chaleur)	Ft	1,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €

[EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve — Situation n°1 — Mars 2026 Contrat Game · by EBGC Page 1 / 3

PDF de situation (A4 paysage) : tableau des lignes du Détail estimatif, cumuls et avancements.

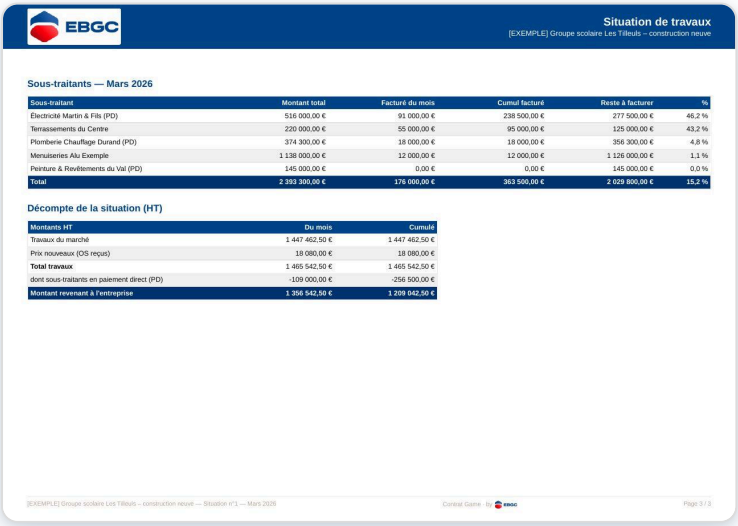

EBGC

Situation de travaux
[EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve

Sous-traitants — Mars 2026

Sous-traitant	Montant total	Facturé du mois	Cumul facturé	Reste à facturer	%
Électricité Martin & Fils (PD)	516 000,00 €	91 000,00 €	238 500,00 €	277 500,00 €	46,2 %
Terrassements du Centre	220 000,00 €	55 000,00 €	95 000,00 €	125 000,00 €	43,2 %
Plomberie Chauffage Durand (PD)	374 300,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	356 300,00 €	4,8 %
Menuiseries Alu Exemple	1 138 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	1 126 000,00 €	1,1 %
Peinture & Revêtements du Val (PD)	145 000,00 €	0,00 €	0,00 €	145 000,00 €	0,0 %
Total	**2 393 300,00 €**	**176 000,00 €**	**363 500,00 €**	**2 029 800,00 €**	**15,2 %**

Décompte de la situation (HT)

Montants HT	Du mois	Cumulé
Travaux du marché	1 447 462,50 €	1 447 462,50 €
Prix nouveaux (OS reçus)	18 080,00 €	18 080,00 €
Total travaux	1 465 542,50 €	1 465 542,50 €
dont sous-traitants en paiement direct (PD)	-109 000,00 €	-256 500,00 €
Montant revenant à l'entreprise	**1 356 542,50 €**	**1 209 042,50 €**

Dernière page : sous-traitants du mois et décompte de la situation.

En-tête société

Logo de votre profil, titre et nom du projet, pagination « Page X / Y ».


Excel

Export .xlsx mis en forme aux couleurs VINCI, pour retravailler les chiffres.

GESTION FINANCIÈRE

Prix nouveaux

Suivez chaque devis de travaux supplémentaires, de sa présentation à son acceptation par ordre de service, et mesurez le potentiel de chiffre d'affaires.

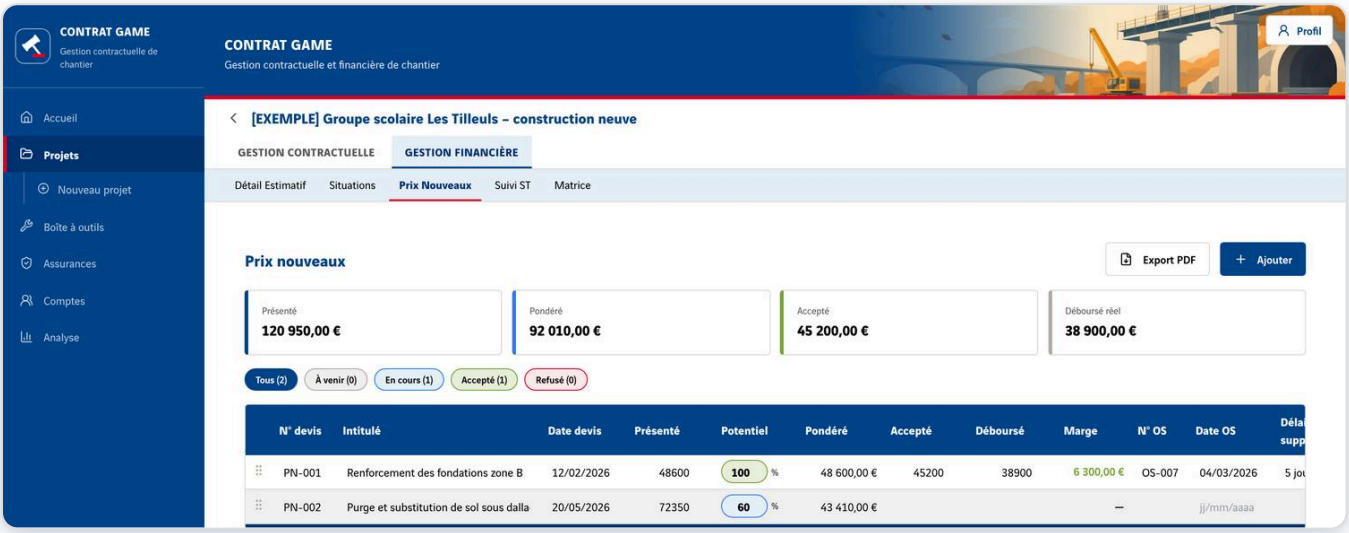

Prix nouveaux : totaux présenté, pondéré, accepté et déboursé, filtres par statut.

Présenté
Montant total des devis transmis

Pondéré
Présenté × potentiel d'acceptation

Accepté
Montants validés par OS

Déboursé
Coût réel engagé, marge calculée

Fiche complète
N° de devis, intitulé, date, montant présenté, potentiel (0-100 %), montant accepté, déboursé réel.

Ordres de service
N° et date d'OS, délai supplémentaire obtenu. Un prix nouveau avec OS reçu entre dans les situations.

Statuts colorés
À venir, en cours, accepté, refusé : badges aux couleurs sémantiques VINCI.


Priorisation
Réordonnancement par glisser-déposer et export PDF de la liste.

Dès qu'un **ordre de service** est renseigné, le prix nouveau apparaît dans la section « Prix nouveaux — OS reçus » des **situations**, où son avancement est saisi en pourcentage.

GESTION FINANCIÈRE

Suivi des sous-traitants

Le suivi financier de chaque sous-traitant : marché + avenants, facturé, reste à facturer et avancement, avec le détail des facturations mensuelles.

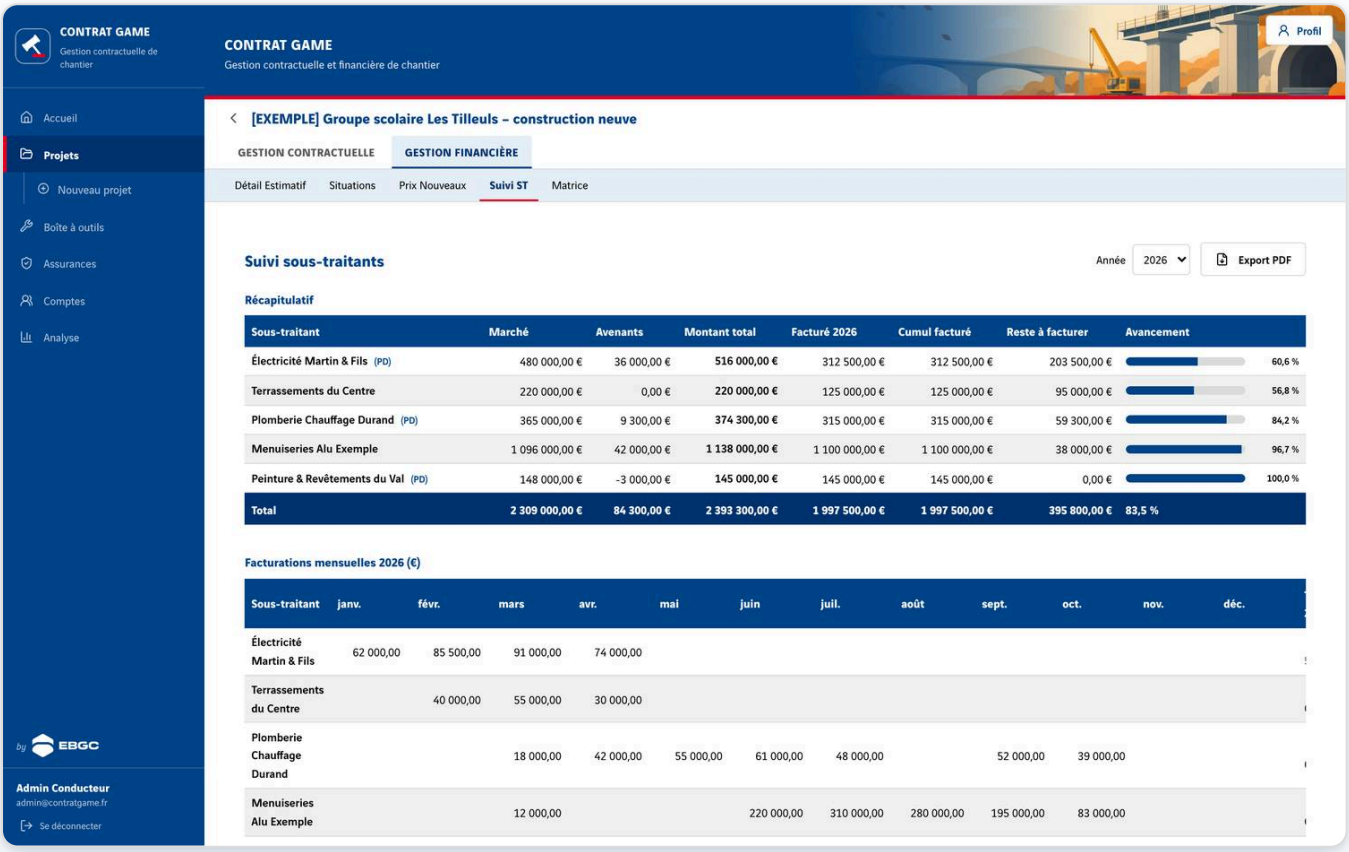

Récapitulatif par sous-traitant (PD = paiement direct) et facturations mensuelles de l'année.

Avancement financier

Marché + avenants = montant total ; cumul facturé, reste à facturer, % d'avancement.

Facturations mensuelles

Un montant par sous-traitant et par mois, saisi ici ou directement dans la situation du mois.

Synchronisé avec les situations

Supprimer une situation met à jour le récapitulatif des sous-traitants.

Export PDF


Tableau récapitulatif et facturations de l'année sélectionnée.

Une seule saisie, deux usages : le montant facturé saisi dans la **situation du mois** apparaît ici, et inversement.


GESTION FINANCIÈRE

Matrice décisionnelle fournisseurs

Comparez objectivement les offres fournisseurs avec la grille « Bid Comp » : critères notés et pondérés, non-conformités, score et recommandation argumentée.

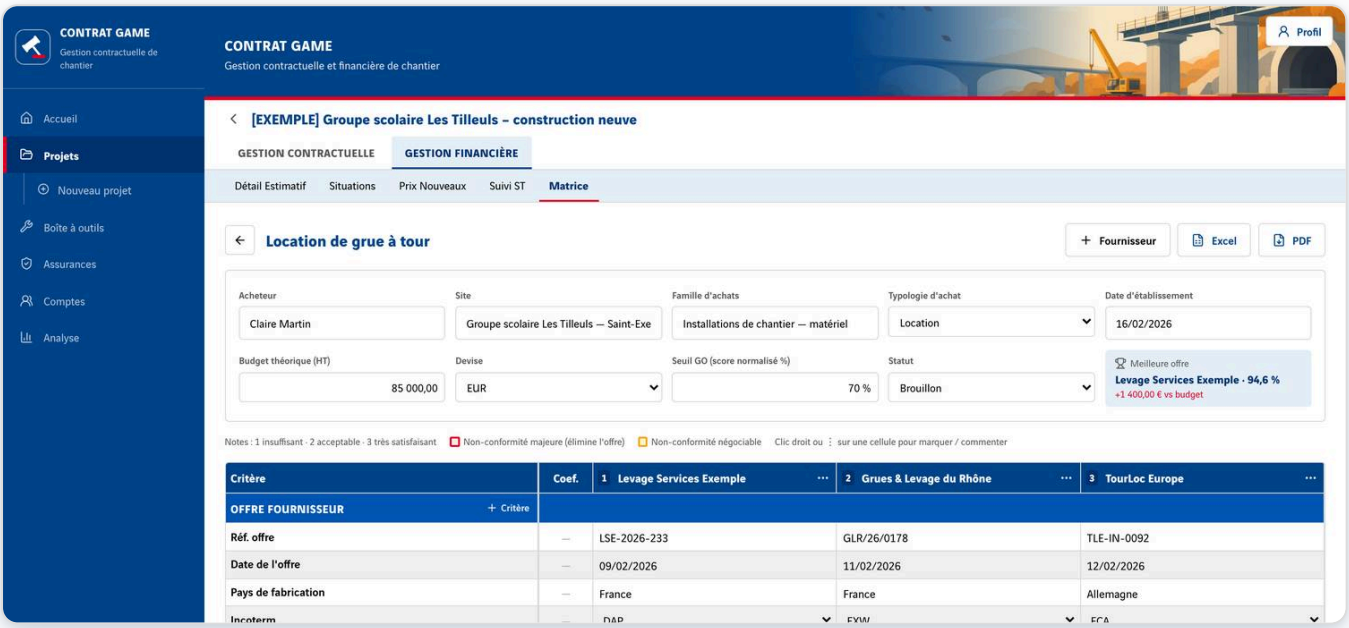

Grille Bid Comp : une colonne par fournisseur, critères notés de 1 à 3 avec coefficients.

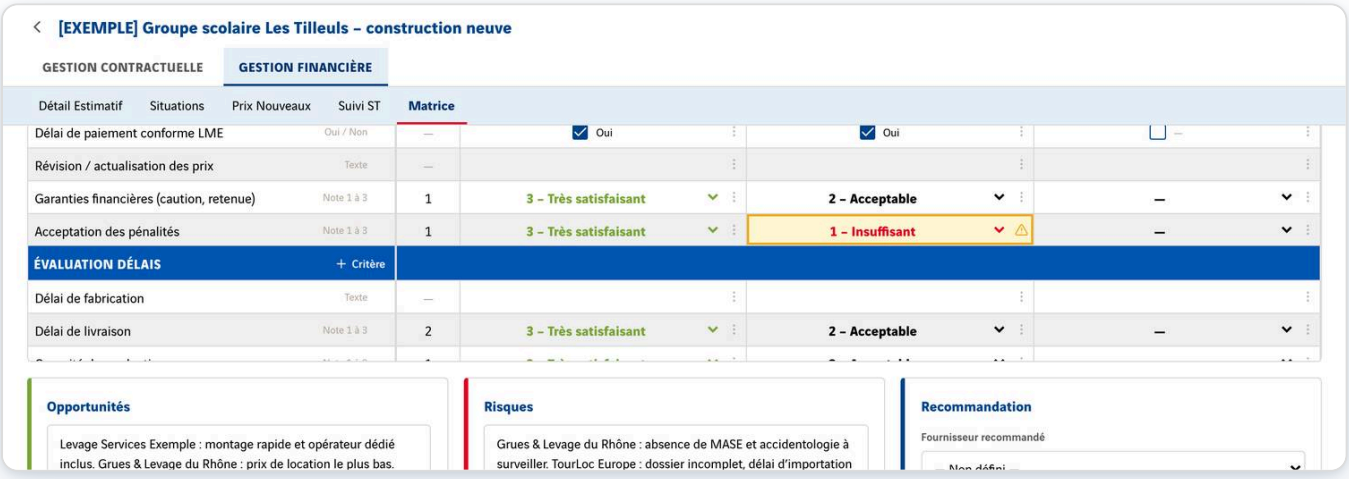

Synthèse : opportunités, risques, recommandation et classement des offres (GO / EN ATTENTE / NO GO).

Grille complète

Offre, conditions financières, délais, juridique, qualité-prévention, technique, CSRD, coûts, options.

Non-conformités

Majeures (rouge) ou négociables (jaune), immédiatement visibles dans la grille.

Score & classement

Score pondéré, score normalisé en %, décision suggérée selon le seuil GO.


Exports Excel & PDF

Classeur Excel « Bid Comp » + « Sélection RMS » mis en forme, et PDF de synthèse.


BOÎTE À OUTILS

L'aide-mémoire du conducteur de travaux

Accessible depuis la barre latérale, la Boîte à outils rassemble les références contractuelles (CCAG Travaux 2021, code de la commande publique) et des outils prêts à l'emploi. Sources et versions sont indiquées en bas de chaque page.

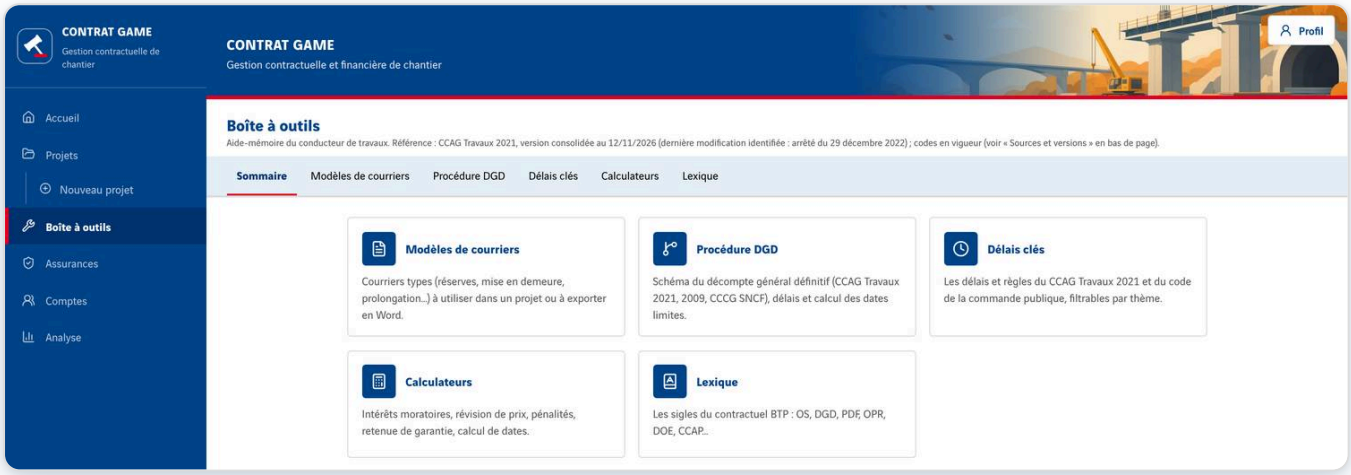

Sommaire de la Boîte à outils : cinq rubriques.

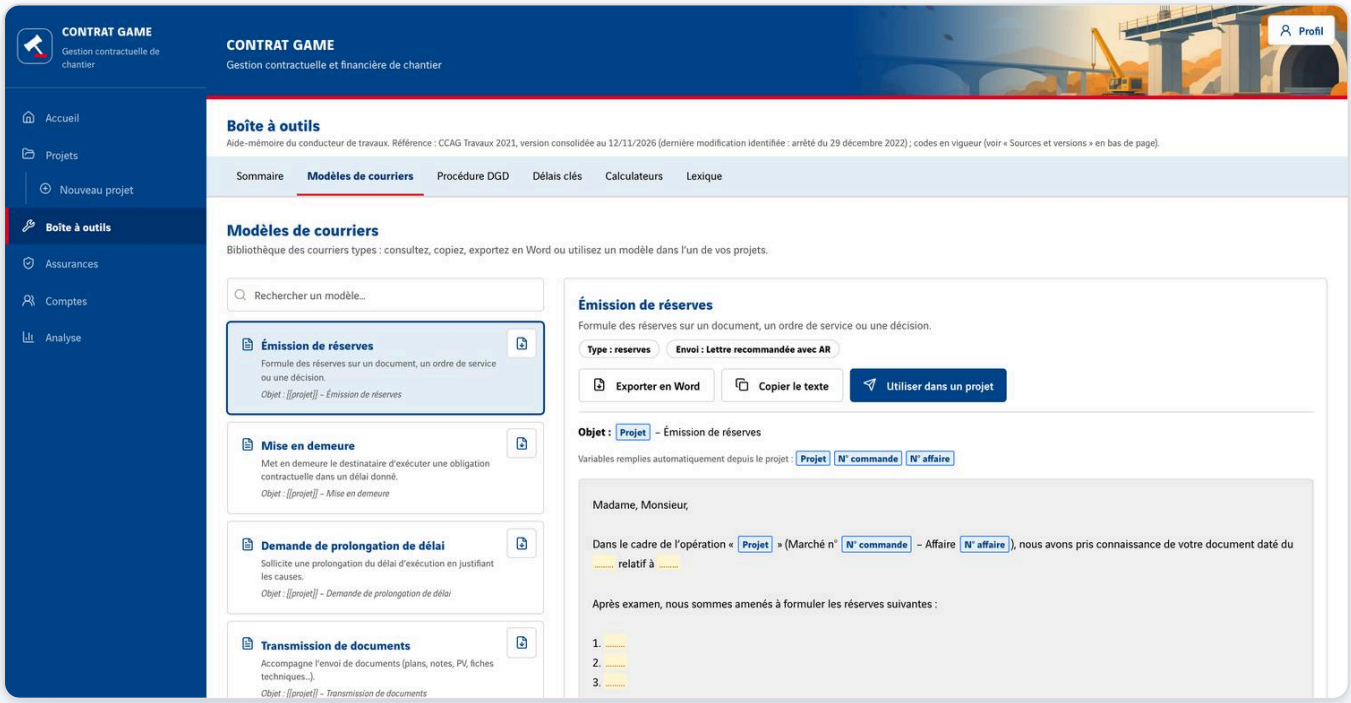

Modèles de courriers : aperçu, variables du projet, export Word, copie du texte ou utilisation dans un projet.

Modèles de courriers

Réserves, mise en demeure, prolongation de délai, transmission, prix nouveau, constat, accusé de réception…

Export Word

Le modèle se télécharge en .docx pour être adapté librement.


Utiliser dans un projet

Un clic ouvre un nouveau courrier pré-rempli avec les références du projet choisi.


BOÎTE À OUTILS

Procédure DGD & délais clés


Le schéma du décompte général définitif, du projet de décompte final à la forclusion, avec ses délais et un calculateur de dates limites. Les délais clés du marché sont filtrables par thème.

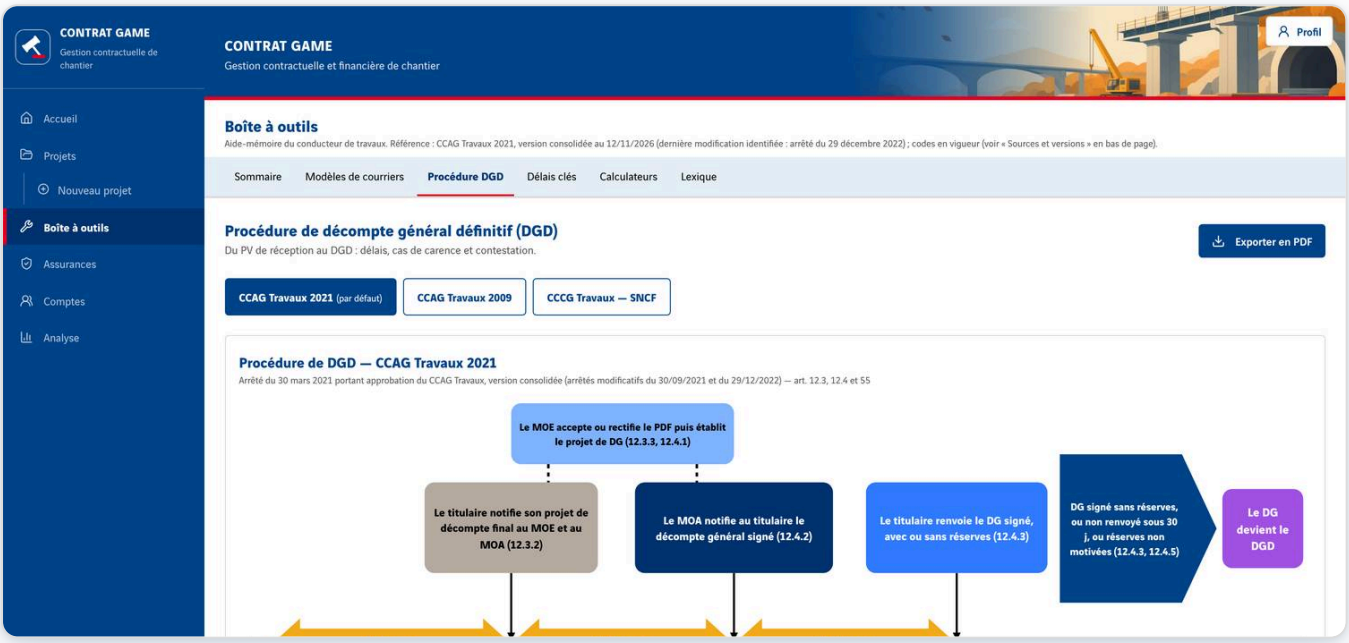

Procédure de DGD selon le CCAG Travaux 2021 (au choix : CCAG 2021, CCAG 2009, CCCG Travaux SNCF).

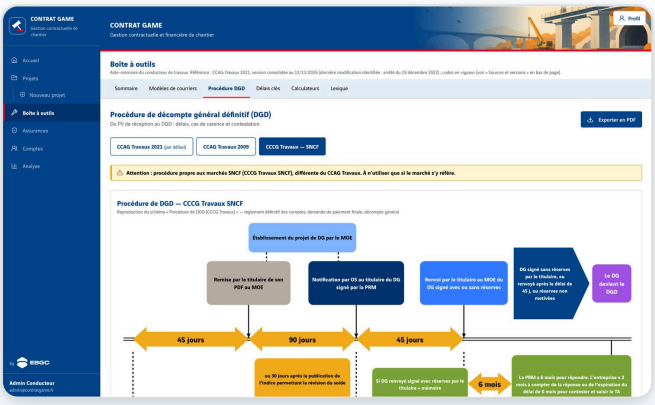

CCCG Travaux SNCF : bandeau d'avertissement, procédure propre aux marchés SNCF.

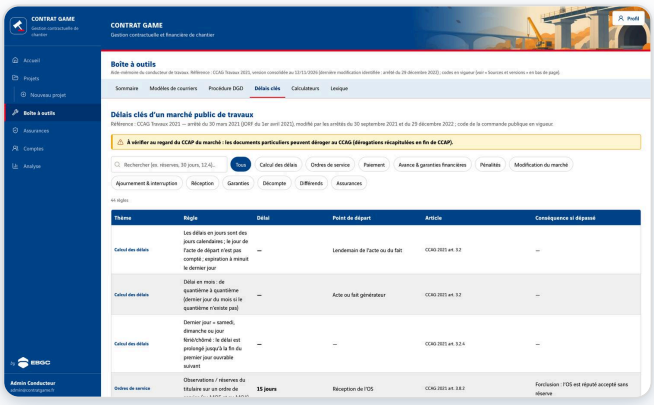

Délais clés : recherche, filtres par thème, articles de référence.

Trois référentiels

CCAG Travaux 2021, CCAG 2009 et CCCG Travaux SNCF, avec un avertissement lorsque la procédure diffère.

Dates limites calculées

À partir de vos dates (réception, envoi du projet de décompte…), avec tableau récapitulatif et export PDF.

Délais clés

Ordres de service, paiement, ajournement, réception, garanties, différends… et conséquences en cas de dépassement.

À vérifier au CCAP


Rappel systématique : les pièces particulières du marché peuvent déroger au CCAG.

BOÎTE À OUTILS

Calculateurs

Des pastilles de choix donnent accès à cinq calculateurs instantanés, avec les valeurs par défaut du CCAG Travaux 2021 et du code de la commande publique. Rien n'est enregistré.

Intérêts moratoires | **Pénalités de retard** | **Révision de prix** | **Retenue de garantie** | **Calcul de dates**

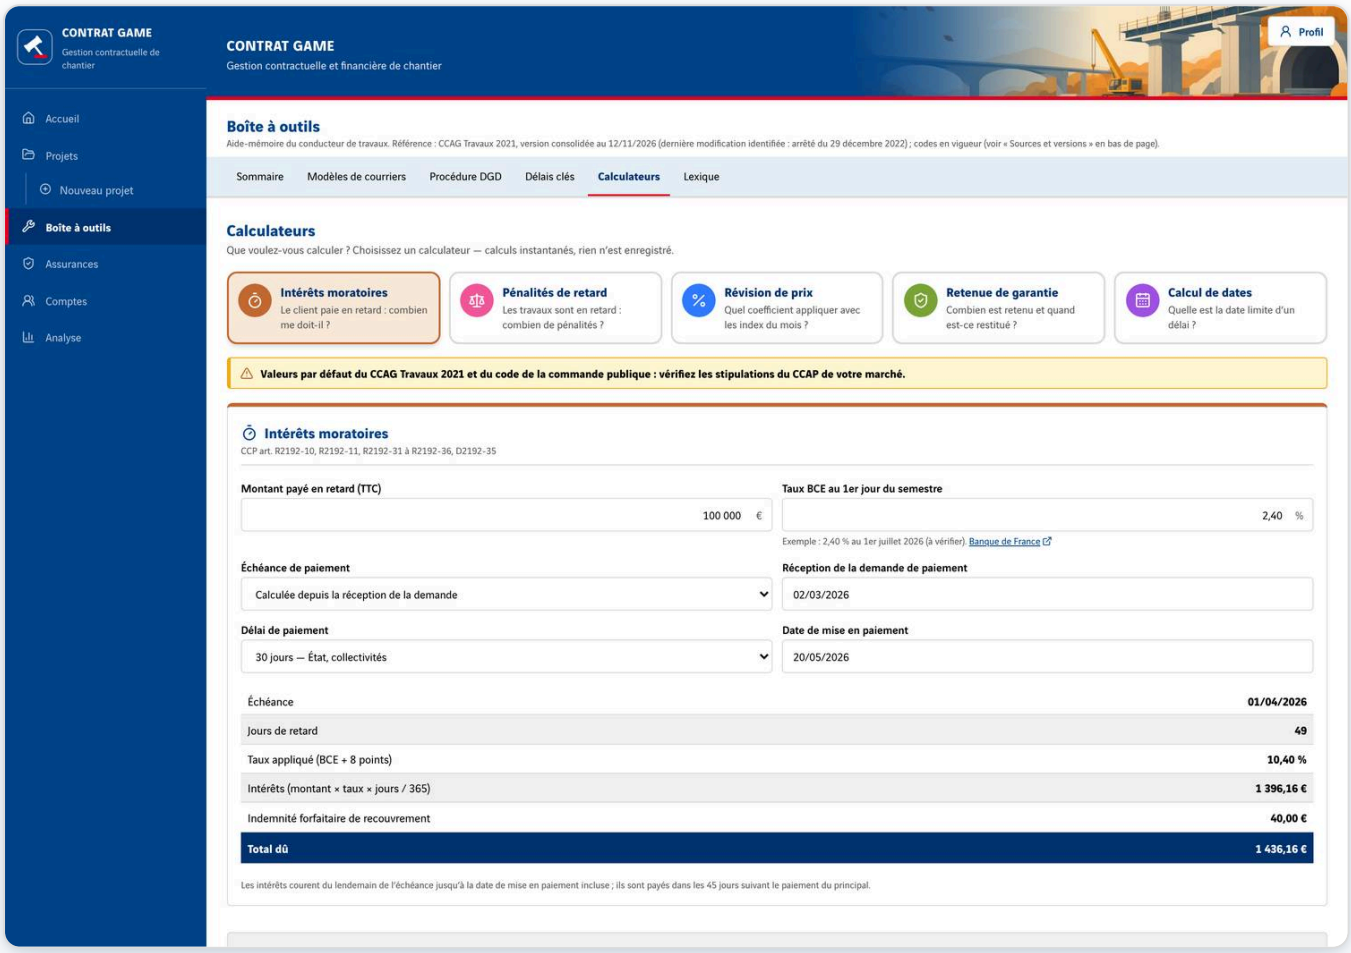

Intérêts moratoires : échéance, jours de retard, taux BCE + 8 points, intérêts et indemnité forfaitaire de recouvrement.

Intérêts moratoires

Délai de paiement, taux BCE, intérêts dus et indemnité forfaitaire de 40 €.

Pénalités de retard

Montant des pénalités selon le retard et le mode de calcul du marché.

Révision de prix

Coefficient de révision à partir des index du mois.


Retenue de garantie & dates

Montant retenu et date de restitution ; calcul de dates limites en jours ou en mois.

BOÎTE À OUTILS

Lexique du contractuel BTP

Les sigles et notions courantes des marchés de travaux, expliqués simplement et rattachés aux textes de référence.

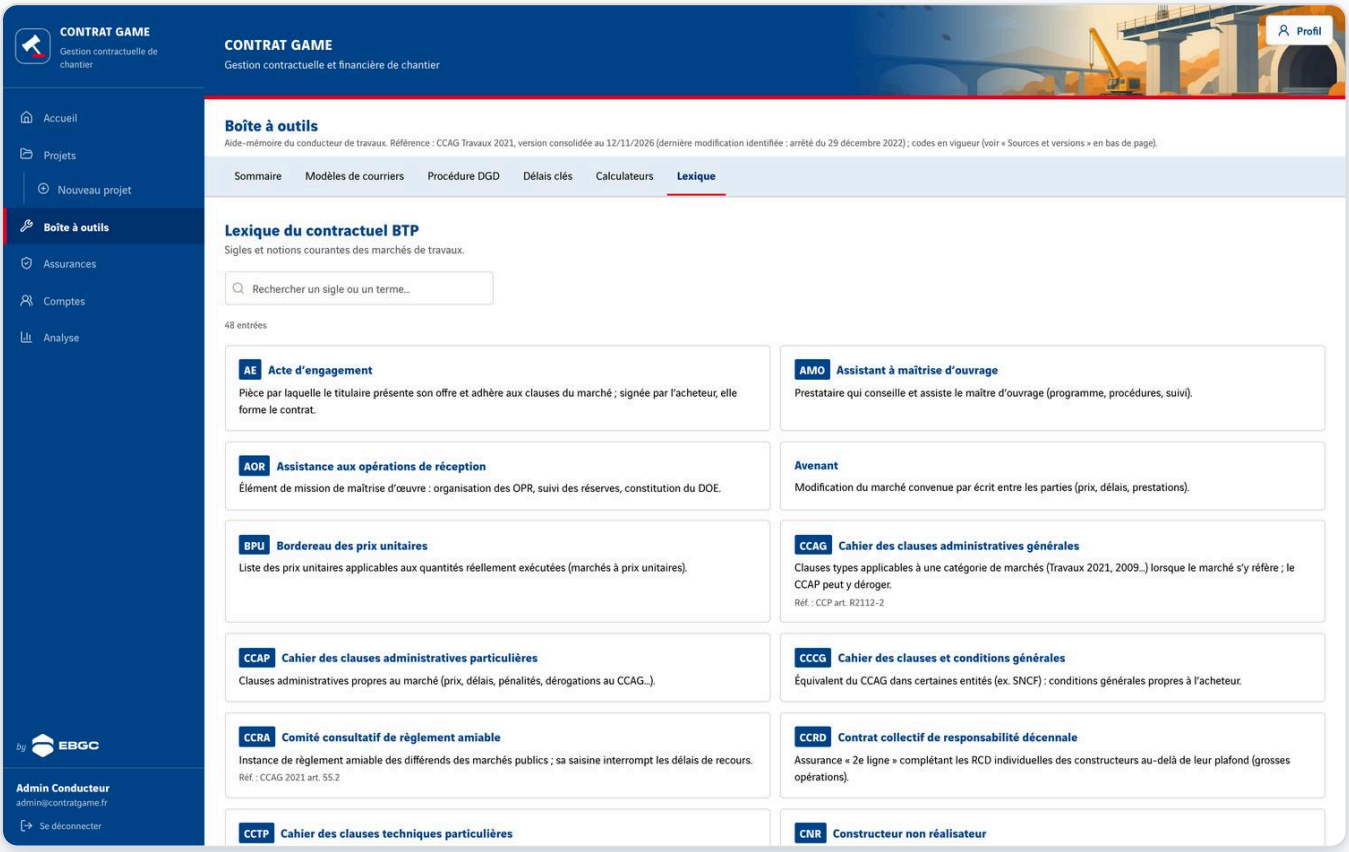

Lexique : recherche instantanée par sigle ou par notion.

Sigles du marché

AE, AOR, BPU, CCAP, CCAG, CCTP, DGD, DOE, OPR, OS, PV…

Références

Article du CCAG ou du code de la commande publique indiqué sous chaque définition.

Recherche instantanée

Filtrage au fil de la frappe, sur le sigle comme sur la définition.

Toujours à portée de main


Depuis la barre latérale, sans quitter le projet en cours.

Toutes les rubriques de la Boîte à outils indiquent leurs **sources et versions** (CCAG Travaux 2021 consolidé, code de la commande publique) en bas de page ; les pièces particulières du marché prévalent.


ASSURANCES · NOUVEL ONGLET

Assurances & garanties

Un onglet dédié de la barre latérale, enrichi d'après le **Guide des assurances 2026** : qui assure quoi, pour qui et quand, de la signature du marché à dix ans après réception, et quelle garantie mobiliser face à un désordre.

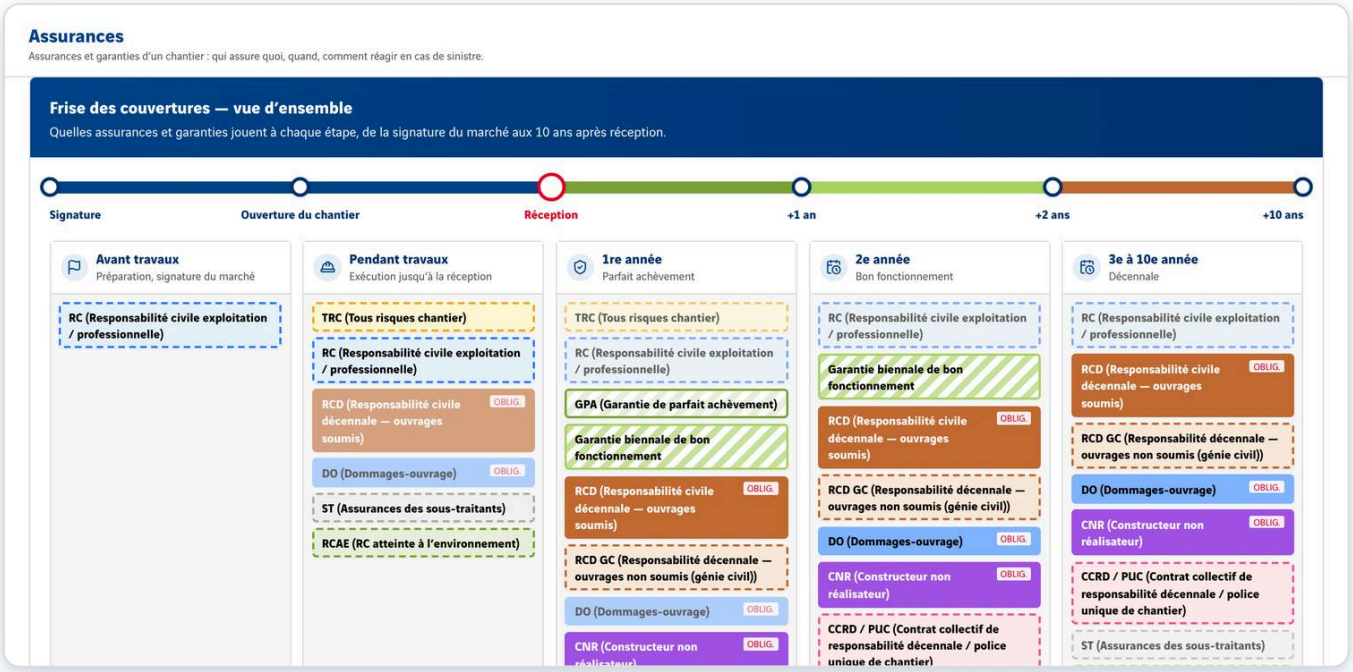

Frise des couvertures — vue d'ensemble : assurances et garanties actives à chaque étape, obligatoires ou facultatives.

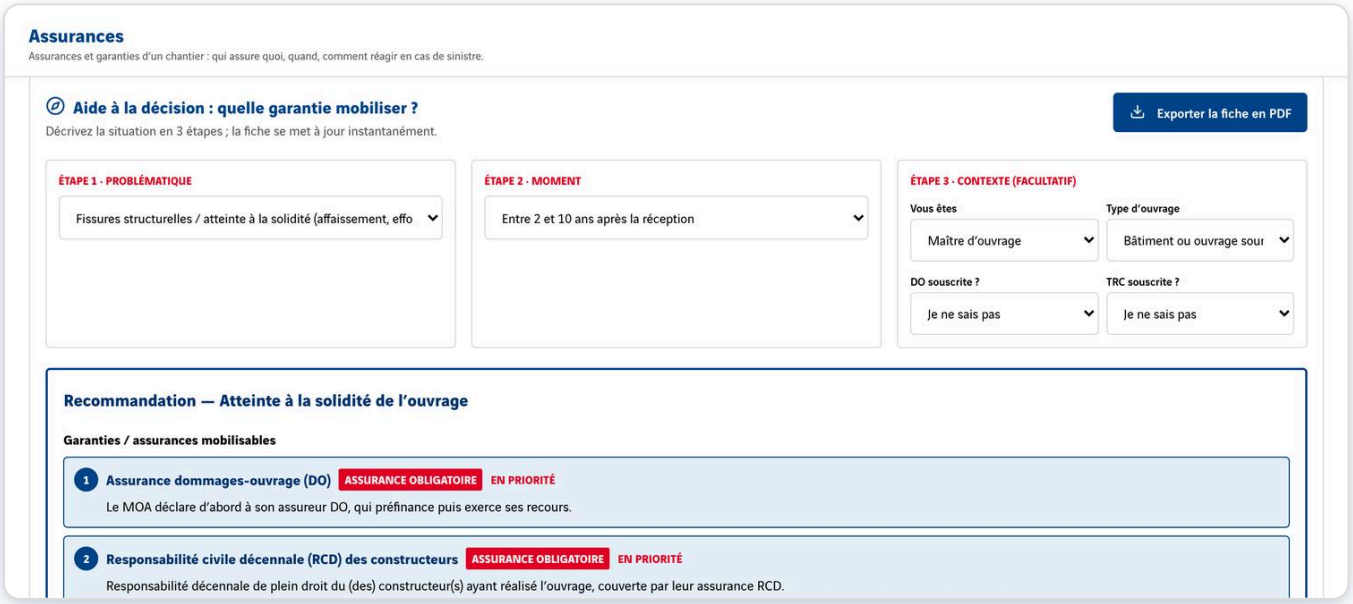

Aide à la décision : problématique, moment et contexte, puis garanties à mobiliser, qui agit contre qui et étapes à suivre.

Vue d'ensemble

TRC, RC, DO, RCD, RCD génie civil, GPA, biennale, CNR, CCRD… positionnées dans le temps.

Aide à la décision

De nouvelles problématiques, une recommandation instantanée, exportable en PDF.


Selon votre situation

Une seconde frise filtrée selon votre rôle, le type d'ouvrage et les polices souscrites.


ASSURANCES

Bons réflexes, fiches & sinistres


Avant la remise du prix, les bons réflexes selon que l'ouvrage est soumis ou non à l'obligation d'assurance ; pendant le chantier, une fiche par garantie et la conduite à tenir en cas de sinistre.

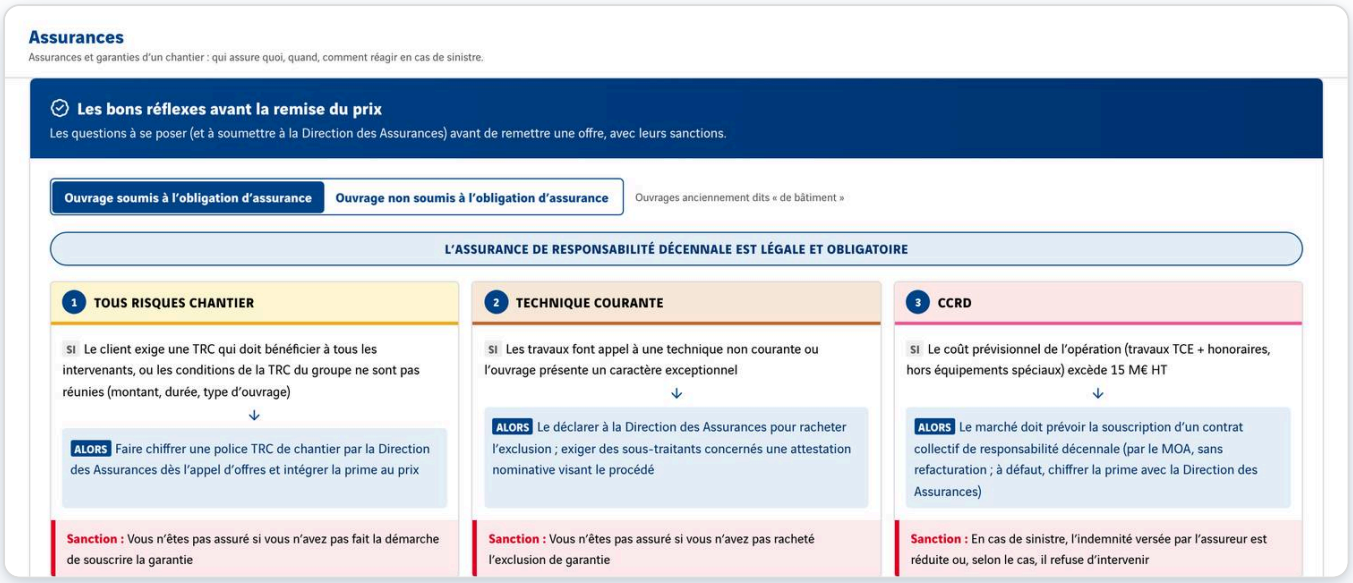

« Les bons réflexes avant la remise du prix » : ouvrage soumis / non soumis à l'obligation d'assurance, sanctions, attestation décennale d'un sous-traitant.

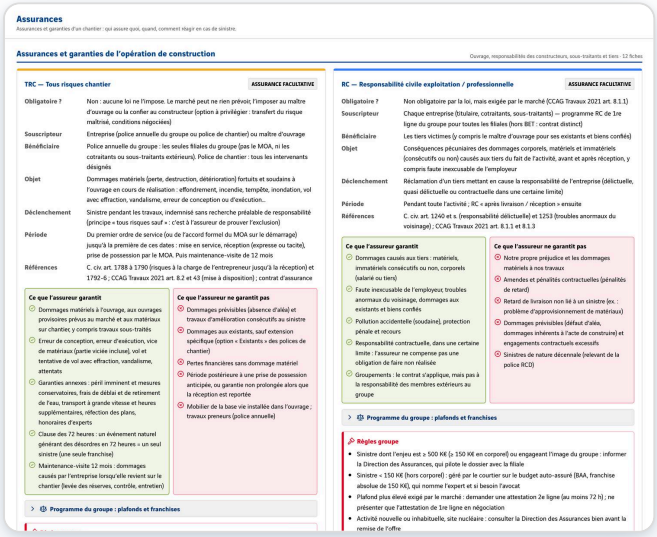

Fiche TRC : ce que l'assureur garantit / ne garantit pas, programme du groupe, règles groupe.

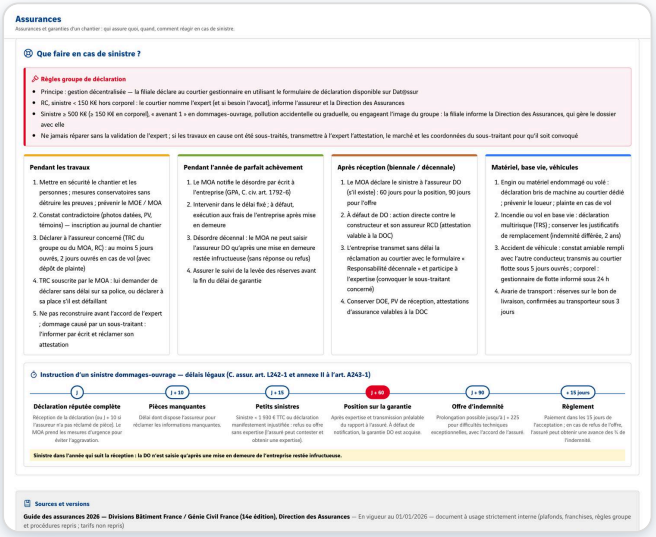

Que faire en cas de sinistre : règles groupe, étapes par période et délais de la procédure dommages-ouvrage.

Fiches enrichies

Garanti / non garanti, plafonds et franchises du programme groupe, règles groupe et points d'attention.

Nouvelles fiches

RCD génie civil, BET, bris de machine, multirisque bases vie, transport, travaux nautiques, automobile, drone et cyber.

Sinistres revus

Réflexes pendant les travaux, en année de parfait achèvement, après réception et pour le matériel.


Procédure DO complète

Déclaration, pièces, position de l'assureur, offre d'indemnité, règlement : délais légaux sur une frise.

ADMINISTRATION

Analyse

Un onglet réservé à l'administrateur pour suivre l'utilisation de l'outil : visites, pages consultées, comptes et projets.

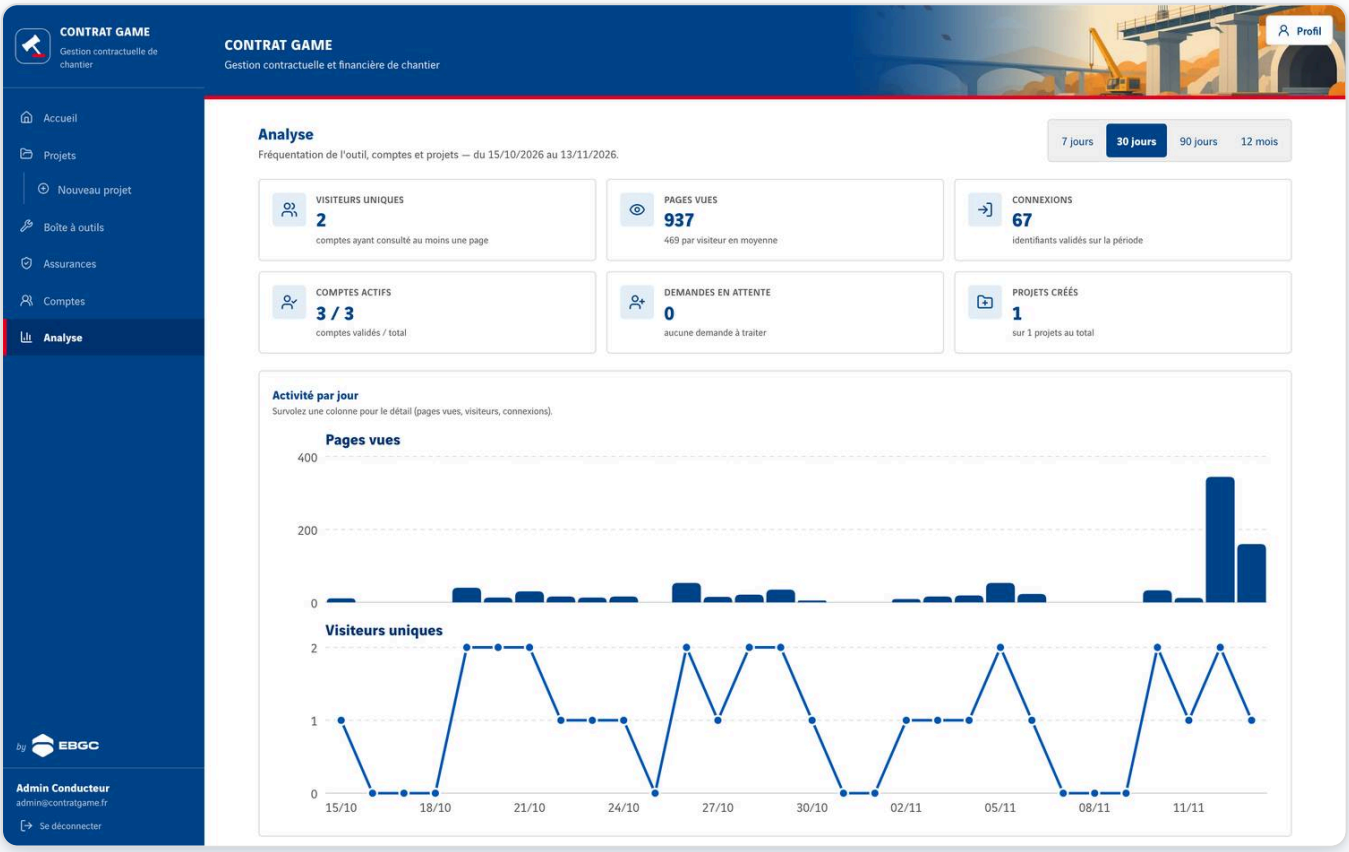

Indicateurs de fréquentation sur 7 jours, 30 jours, 90 jours ou 12 mois, et activité par jour.

Fréquentation

Visiteurs uniques, pages vues, connexions, activité jour par jour.

Pages les plus consultées

Les modules réellement utilisés par les équipes.

Comptes

Comptes actifs, demandes en attente, inscriptions par mois, statuts et rôles.

Projets


Projets créés, projets les plus actifs et projets par propriétaire.

L'onglet **Analyse** n'apparaît que pour les administrateurs ; les autres utilisateurs ne voient que leurs propres projets.

ADMINISTRATION

Comptes & sécurité

Chacun peut demander la création de son compte ; l'administrateur valide la demande avant tout accès à l'outil. Chaque nouvel utilisateur reçoit un projet d'exemple pour découvrir les modules.

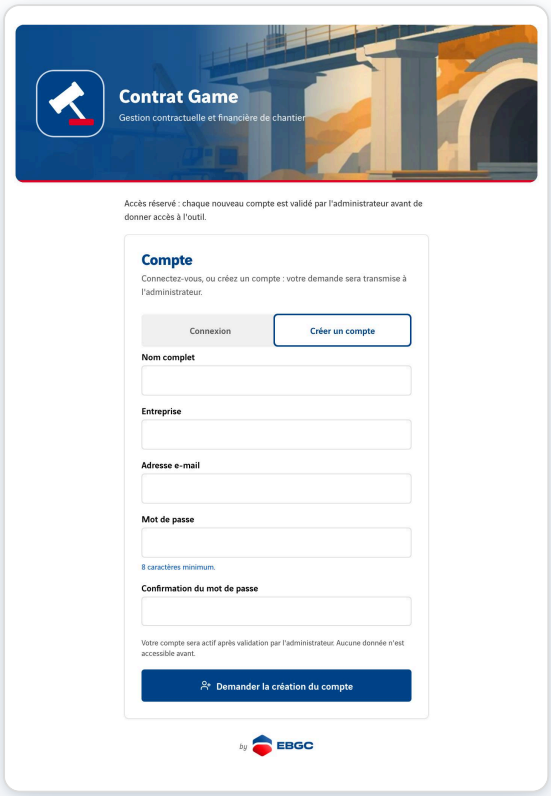

Demande de création de compte.

Validation par l'administrateur

Un compte créé reste « en attente » : aucune donnée n'est accessible avant validation.

Projet d'exemple offert


À la validation, l'utilisateur reçoit sa copie du projet « [EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls ».

Accès par projet

Chacun ne voit que les projets dont il est membre ; toutes les actions vérifient cette appartenance côté serveur.

Authentification

Connexion par e-mail et mot de passe, mots de passe hachés, session sécurisée.

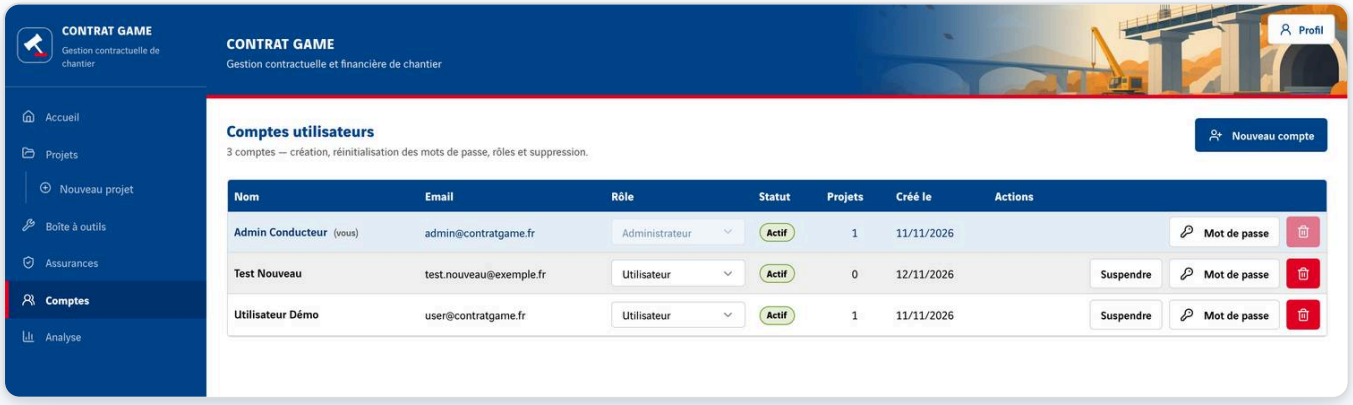


Gestion des comptes : rôle, statut, projets, validation, suspension, réinitialisation du mot de passe.

PERSONNALISATION

Profil & en-tête société

Le profil réunit vos informations personnelles et celles de votre société. Le logo et le nom de société figurent en en-tête de tous les PDF générés.

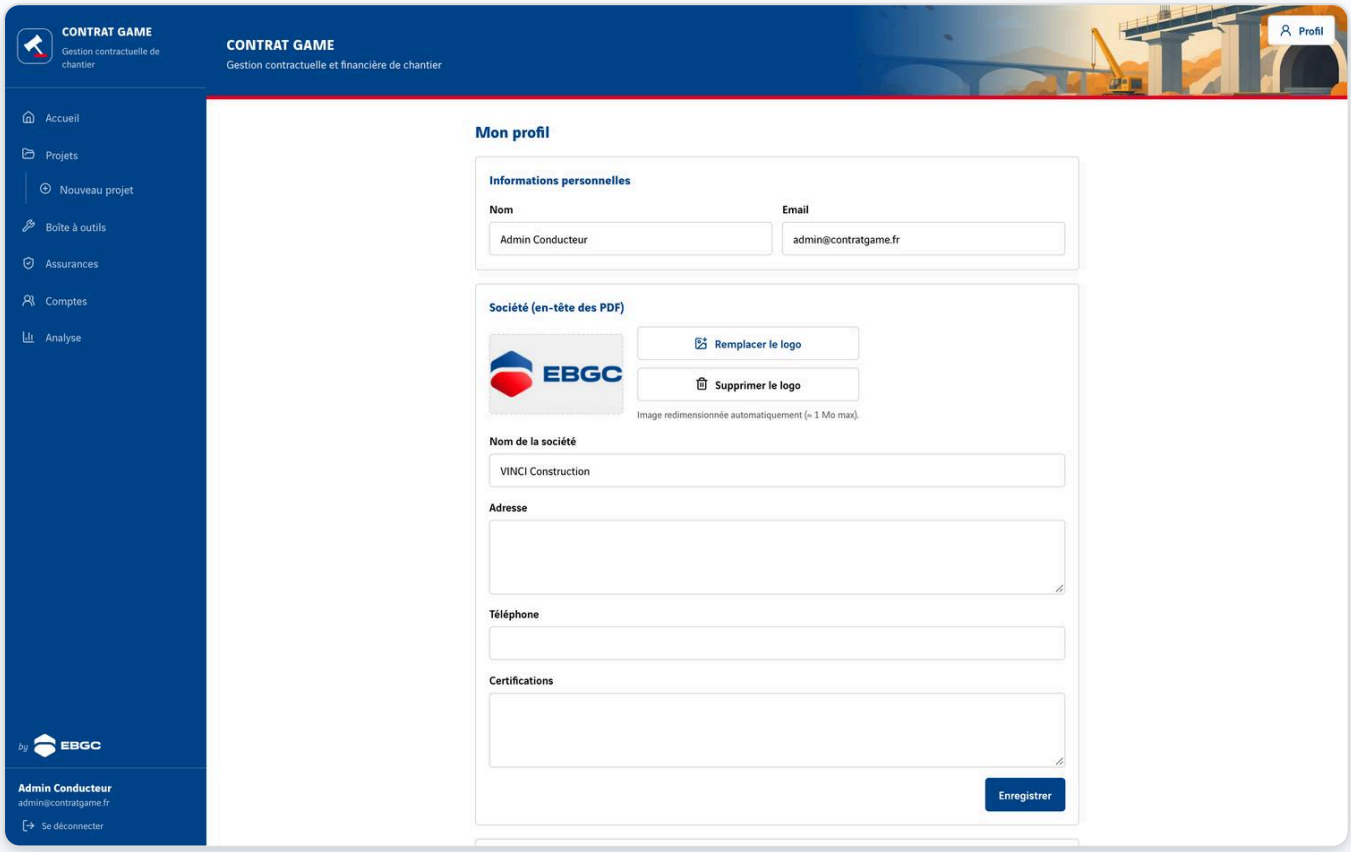

Profil : informations personnelles, société (logo, nom, adresse, téléphone, certifications), mot de passe.



Logo de la société en en-tête (ici, Détail estimatif).

Logo sur tous les PDF

Détail estimatif, situations, courriers, liste de diffusion, frise, fiche écart, matrice…

Image optimisée

Le logo est redimensionné automatiquement à l'import.


Coordonnées société

Adresse, téléphone et certifications pour les courriers officiels.

DOCUMENTS

Exports PDF & Excel

Chaque module produit des documents prêts à transmettre, à la charte de votre entreprise : en-tête bleu, logo société, tableaux lisibles, pagination.

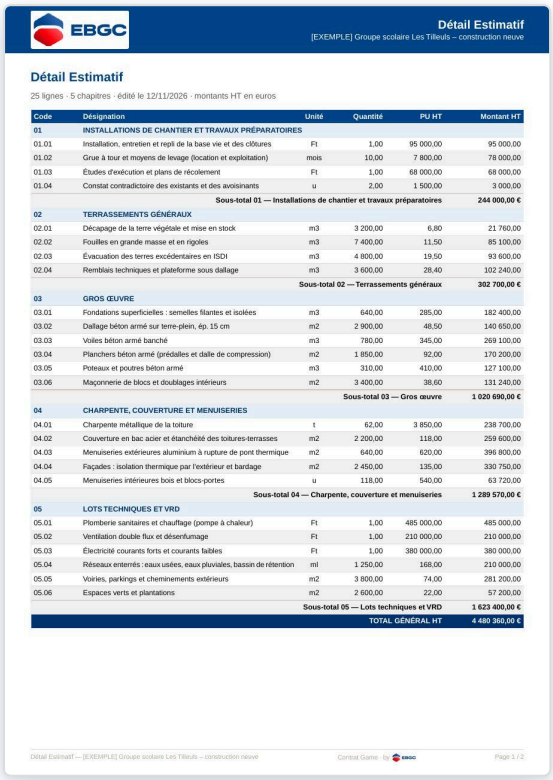
EBGC

Détail Estimatif
[EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve


Détail Estimatif

25 lignes · 5 chapitres · édité le 12/11/2026 · montants HT en euros

Code	Désignation	Unité	Quantité	PU HT	Montant HT
01	INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
01.01	Installation, entretien et repli de la base vie et des clôtures	Ft	1,00	95 000,00	95 000,00
01.02	Grue à tour et moyens de levage (location et exploitation)	mois	10,00	7 800,00	78 000,00
01.03	Études d'exécution et plans de récolement	Ft	1,00	68 000,00	68 000,00
01.04	Constat contradictoire des existants et des avoisinants	u	2,00	1 500,00	3 000,00
				Sous-total 01 — Installations de chantier et travaux préparatoires	244 000,00 €
02	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX				
02.01	Décapage de la terre végétale et mise en stock	m3	3 200,00	6,80	21 760,00
02.02	Fouilles en grande masse et en rigoles	m3	7 400,00	11,50	85 100,00
02.03	Évacuation des terres excédentaires en ISDI	m3	4 800,00	19,50	93 600,00
02.04	Remblais techniques et plateforme sous dallage	m3	3 600,00	28,40	102 240,00
				Sous-total 02 — Terrassements généraux	302 700,00 €
03	GROS ŒUVRE				
03.01	Fondations superficielles : semelles filantes et isolées	m3	640,00	285,00	182 400,00
03.02	Dallage béton armé sur terre-plein, ép. 15 cm	m2	2 900,00	48,50	140 650,00
03.03	Voiles béton armé banché	m3	780,00	345,00	269 100,00
03.04	Planchers béton armé (prédalles et dalle de compression)	m2	1 850,00	92,00	170 200,00
03.05	Poteaux et poutres béton armé	m3	310,00	410,00	127 100,00
03.06	Maçonnerie de blocs et doublages intérieurs	m2	3 400,00	38,60	131 240,00
				Sous-total 03 — Gros œuvre	1 020 690,00 €
04	CHARPENTE, COUVERTURE ET MENUISERIES				
04.01	Charpente métallique de la toiture	t	62,00	3 850,00	238 700,00
04.02	Couverture en bac acier et étanchéité des toitures-terrasses	m2	2 200,00	118,00	259 600,00
04.03	Menuiseries extérieures aluminium à rupture de pont thermique	m2	640,00	620,00	396 800,00
04.04	Façades : isolation thermique par l'extérieur et bardage	m2	2 450,00	135,00	330 750,00
04.05	Menuiseries intérieures bois et blocs-portes	u	118,00	540,00	63 720,00
				Sous-total 04 — Charpente, couverture et menuiseries	1 289 570,00 €
05	LOTS TECHNIQUES ET VRD				
05.01	Plomberie sanitaires et chauffage (pompe à chaleur)	Ft	1,00	485 000,00	485 000,00
05.02	Ventilation double flux et désenfumage	Ft	1,00	210 000,00	210 000,00
05.03	Électricité courants forts et courants faibles	Ft	1,00	380 000,00	380 000,00
05.04	Réseaux enterrés : eaux usées, eaux pluviales, bassin de rétention	ml	1 250,00	168,00	210 000,00
05.05	Voiries, parkings et cheminements extérieurs	m2	3 800,00	74,00	281 200,00
05.06	Espaces verts et plantations	m2	2 600,00	22,00	57 200,00
				Sous-total 05 — Lots techniques et VRD	1 623 400,00 €
				TOTAL GÉNÉRAL HT	4 480 360,00 €

Détail Estimatif — [EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve
Contrat Game · by EBGC
Page 1 / 2

Détail estimatif (PDF A4).

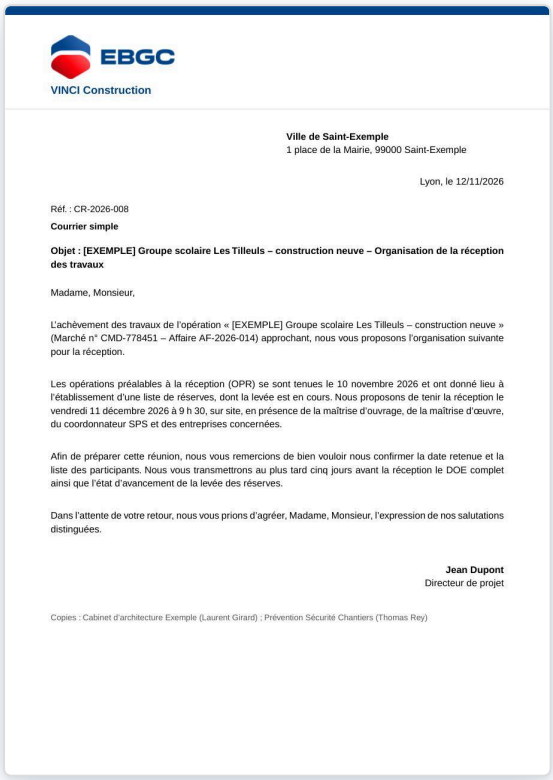
EBGC
VINCI Construction

Ville de Saint-Exemple
1 place de la Mairie, 99000 Saint-Exemple

Lyon, le 12/11/2026

Réf. : CR-2026-008
Courrier simple

Objet : [EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve – Organisation de la réception des travaux

Madame, Monsieur,

L'achèvement des travaux de l'opération « [EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve » (Marché n° CMD-778451 – Affaire AF-2026-014) approchant, nous vous proposons l'organisation suivante pour la réception.

Les opérations préalables à la réception (OPR) se sont tenues le 10 novembre 2026 et ont donné lieu à l'établissement d'une liste de réserves, dont la levée est en cours. Nous proposons de tenir la réception le vendredi 11 décembre 2026 à 9 h 30, sur site, en présence de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, du coordonnateur SPS et des entreprises concernées.


Afin de préparer cette réunion, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer la date retenue et la liste des participants. Nous vous transmettrons au plus tard cinq jours avant la réception le DOE complet ainsi que l'état d'avancement de la levée des réserves.

Dans l'attente de votre retour, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean Dupont
Directeur de projet

Copies : Cabinet d'architecture Exemple (Laurent Girard) ; Prévention Sécurité Chantiers (Thomas Rey)

Courrier officiel (PDF A4).

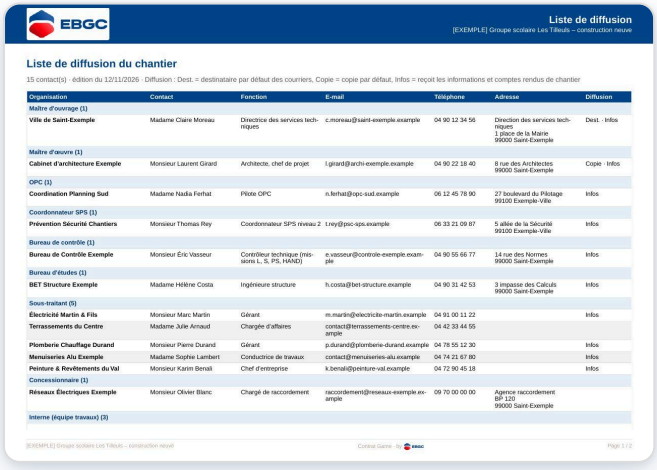
EBGC

Liste de diffusion
[EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve


Liste de diffusion du chantier

15 contact(s) · édition du 12/11/2026 · Diffusion : Dest. = destinataire par défaut des courriers, Copie = copie par défaut, Infos = reçoit les informations et comptes rendus de chantier

Organisation	Contact	Fonction	E-mail	Téléphone	Adresse	Diffusion
Maître d'ouvrage (1)						
Ville de Saint-Exemple	Madame Claire Moreau	Directrice des services techniques	c.moreau@saint-exemple.example	04 90 12 34 56	Direction des services techniques 1 place de la Mairie 99000 Saint-Exemple	Dest. · Infos
Maître d'œuvre (1)						
Cabinet d'architecture Exemple	Monsieur Laurent Girard	Architecte, chef de projet	l.girard@archi-exemple.example	04 90 22 18 40	8 rue des Architectes 99000 Saint-Exemple	Copie · Infos
OPC (1)						
Coordination Planning Sud	Madame Nadia Ferhat	Pilote OPC	n.ferhat@opc-sud.example	06 12 45 78 90	27 boulevard du Pilotage 99100 Exemple-Ville	Infos
Coordonnateur SPS (1)						
Prévention Sécurité Chantiers	Monsieur Thomas Rey	Coordonnateur SPS niveau 2	t.rey@psc-sps.example	06 33 21 09 87	5 allée de la Sécurité 99100 Exemple-Ville	Infos
Bureau de contrôle (1)						
Bureau de Contrôle Exemple	Monsieur Éric Vasseur	Contrôleur technique (missions L, S, PS, HAND)	e.vasseur@controle-exemple.example	04 90 55 66 77	14 rue des Normes 99000 Saint-Exemple	Infos
Bureau d'études (1)						
BET Structure Exemple	Madame Hélène Costa	Ingénieure structure	h.costa@bet-structure.example	04 90 31 42 53	3 impasse des Calculs 99000 Saint-Exemple	Infos
Sous-traitant (5)						
Électricité Martin & Fils	Monsieur Marc Martin	Gérant	m.martin@electricite-martin.example	04 91 00 11 22		Infos
Terrassements du Centre	Madame Julie Arnaud	Chargée d'affaires	contact@terrassements-centre.example	04 42 33 44 55		Infos
Plomberie Chauffage Durand	Monsieur Pierre Durand	Gérant	p.durand@plomberie-durand.example	04 78 55 12 30		Infos
Menuiseries Alu Exemple	Madame Sophie Lambert	Conductrice de travaux	contact@menuiseries-alu.example	04 74 21 67 80		Infos
Peinture & Revêtements du Val	Monsieur Karim Benali	Chef d'entreprise	k.benali@peinture-val.example	04 72 90 45 18		Infos
Concessionnaire (1)						
Réseaux Électriques Exemple	Monsieur Olivier Blanc	Chargé de raccordement	raccordement@reseaux-exemple.example	09 70 00 00 00	Agence raccordement BP 120 99000 Saint-Exemple	
Interne (équipe travaux) (3)						

[EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve
Contrat Game · by EBGC
Page 1 / 2

Liste de diffusion (A4 paysage).

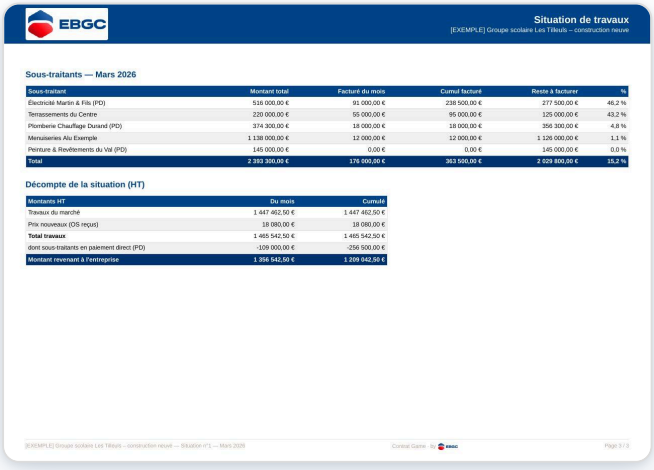
EBGC

Situation de travaux
[EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve

Sous-traitants — Mars 2026

Sous-traitant	Montant total	Facturé du mois	Cumul facturé	Reste à facturer	%
Électricité Martin & Fils (PD)	516 000,00 €	91 000,00 €	238 500,00 €	277 500,00 €	46,2 %
Terrassements du Centre	220 000,00 €	55 000,00 €	95 000,00 €	125 000,00 €	43,2 %
Plomberie Chauffage Durand (PD)	374 300,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	356 300,00 €	4,8 %
Menuiseries Alu Exemple	1 138 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	1 126 000,00 €	1,1 %
Peinture & Revêtements du Val (PD)	145 000,00 €	0,00 €	0,00 €	145 000,00 €	0,0 %
Total	2 393 300,00 €	176 000,00 €	363 500,00 €	2 029 800,00 €	15,2 %

Décompte de la situation (HT)

Montants HT	Du mois	Cumulé
Travaux du marché	1 447 462,50 €	1 447 462,50 €
Prix nouveaux (OS reçus)	18 080,00 €	18 080,00 €
Total travaux	1 465 542,50 €	1 465 542,50 €
dont sous-traitants en paiement direct (PD)	-109 000,00 €	-256 500,00 €
Montant revenant à l'entreprise	1 356 542,50 €	1 209 042,50 €

[EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve — Situation n°1 — Mars 2026
Contrat Game · by EBGC
Page 3 / 3

Situation : sous-traitants et décompte.

- **PDF** : Détail estimatif, situations, prix nouveaux, suivi ST, courriers, liste de diffusion, fiche écart, matrice, DGD, aide à la décision assurances.
- **Frise chronologique** : PDF A4 paysage multi-pages avec périodes, légende et annexes photos.
- **Excel** : situations, liste de diffusion, matrice Bid Comp (2 onglets mis en forme).
- **Word** : courriers et modèles de courriers.
- **Format français** : montants « 1 234,50 € », dates « jj/mm/aaaa ».

PRISE EN MAIN


Démarrer en 3 étapes

Aucune installation : l'application s'ouvre dans le navigateur, sur PC comme sur tablette.

1

Créer son compte


Sur la page de connexion, choisissez « Créer un compte ». Dès validation par l'administrateur, connectez-vous et complétez votre profil société (logo, adresse) : il apparaîtra sur tous vos PDF.



2

Créer un projet


Depuis « Nouveau projet », renseignez le maître d'ouvrage, les références et les dates, choisissez les modules utiles, puis constituez la liste de diffusion et le Détail estimatif.



3

Inviter l'équipe

Dans l'onglet Infos, ajoutez vos collègues par e-mail comme membres du projet. Chacun retrouve aussitôt le projet dans sa liste et peut contribuer.



Astuce

Explorez d'abord le projet **[EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls**, offert à chaque nouvel utilisateur : il contient un jeu de données complet pour découvrir chaque module.

CONTACT

Contrat Game

Gestion contractuelle & financière de chantier

Une question, un besoin d'accès ou une idée d'évolution ? Contactez l'administrateur de l'application dans votre entreprise ou l'équipe EBGC.

ACCÈS

Navigateur web
PC · tablette

COMPTES

Demande en ligne,
validée par l'administrateur

by EBGC
